# Manual técnico

Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Estratégico
Módulo de Gestão do Projetos

SMAE

SMAE.PREFEITURA.SP.FGV.BR

POWERED BY FGV

# ÍNDICE


SMAE

MENU E GLOSSÁRIO DE ÍCONES

LOGIN

ESQUECI MINHA SENHA

PRIMEIROS PASSOS

CONFIGURAÇÕES

PORTFÓLIOS

ANÁLISE

RELATÓRIOS

ENVIO DE ARQUIVOS




# SOBRE A PLATAFORMA SMAE

A Plataforma **"SMAE"** consiste em módulos e funcionalidades desenvolvidas para o cliente para monitorar e acompanhar metas do programa de metas e de planos setoriais, projetos, obras, e a transferência voluntária de recursos provenientes de emendas parlamentares. O módulo de Gestão de Projetos descrito nesse manual foi desenvolvido para acompanhar projetos prioritários e estratégicos.

O **SMAE** é um software livre e de código aberto, com a perspectiva de Administração Pública. Ele é um bem público, pode ser usado e modificado por todos.

# Glossário de ícones

Ao longo do uso da plataforma, alguns ícones aparecerão constantemente seguindo um padrão de uso.

**A seguir, os comandos serão apresentados e explicados.**



# MENU DO SITE - SMAE





- Página inicial
- Portfólios
- Análise
- Relatórios
- Envio de arquivos
- Configurações
- Administração
- Meus módulos

Com o módulo selecionado é possível notar o menu de opções ao lado esquerdo da tela.

# Glossário de ícones

CADASTRAR NOVAS INFORMAÇÕES





No canto superior das páginas haverá a possibilidade de cadastrar novas informações. Sempre que for necessário "**CADASTRAR"**, selecione o botão correspondente.





Poderá aparecer com nomes diversos, conforme a temática do módulo a ser preenchido.

# Glossário de ícones

FECHAR JANELA





No canto superior de todas as páginas de cadastro aparecerá o ícone de **"FECHAR".** Clique sempre que quiser sair da página.




Após clicar no ícone, se desejar continuar sua ação, clique em “**SAIR SEM SALVAR”.** Contudo, caso queira continuar o cadastro, selecione “**CANCELAR”.**

# Glossário de ícones

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

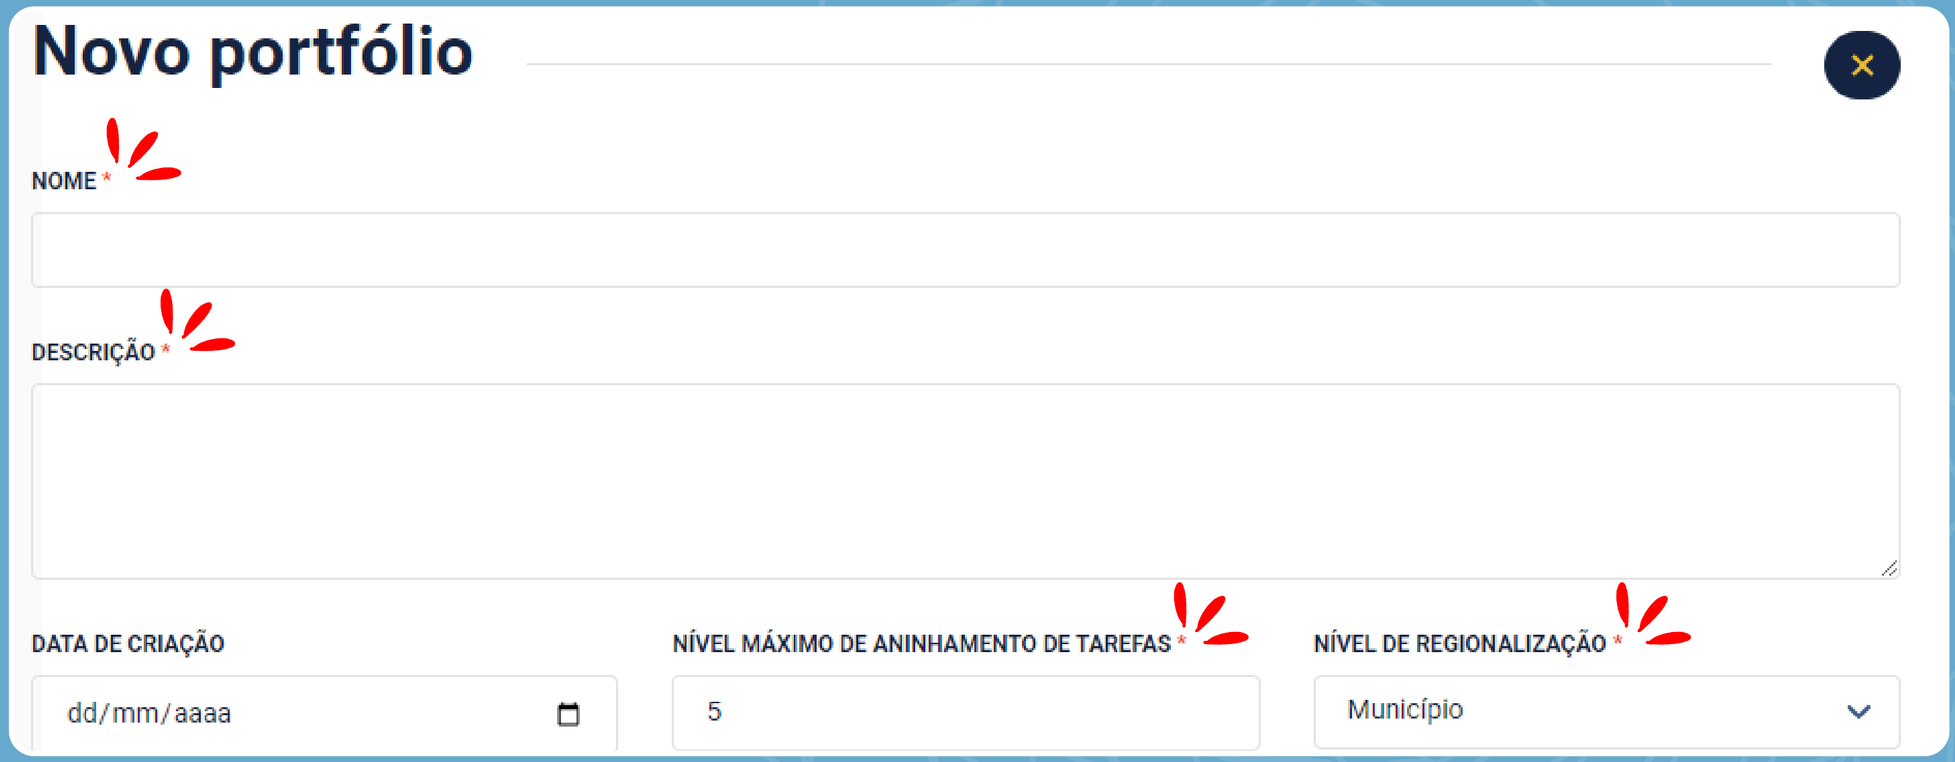



Toda vez que o campo aparecer com um *asterisco vermelho(*)*
o preenchimento é obrigatório.


# Glossário de ícones

REVISÃO DE INFORMAÇÃO

As informações já cadastradas podem ser:





EDITADAS

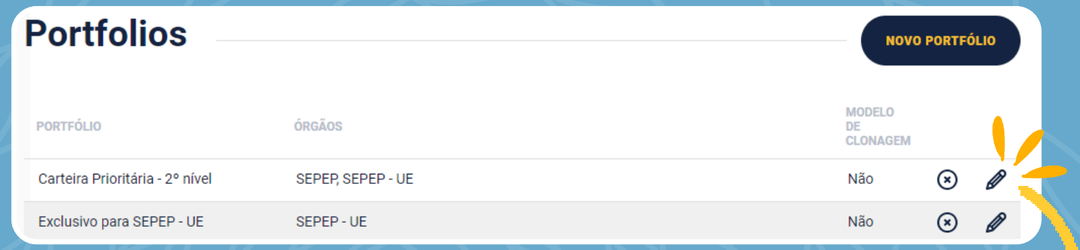


EXCLUÍDAS




ADICIONADAS





EXCLUÍDAS

# Glossário de ícones


SELEÇÃO DE INFORMAÇÕES


Alguns campos apresentam opções para seleção da informação.







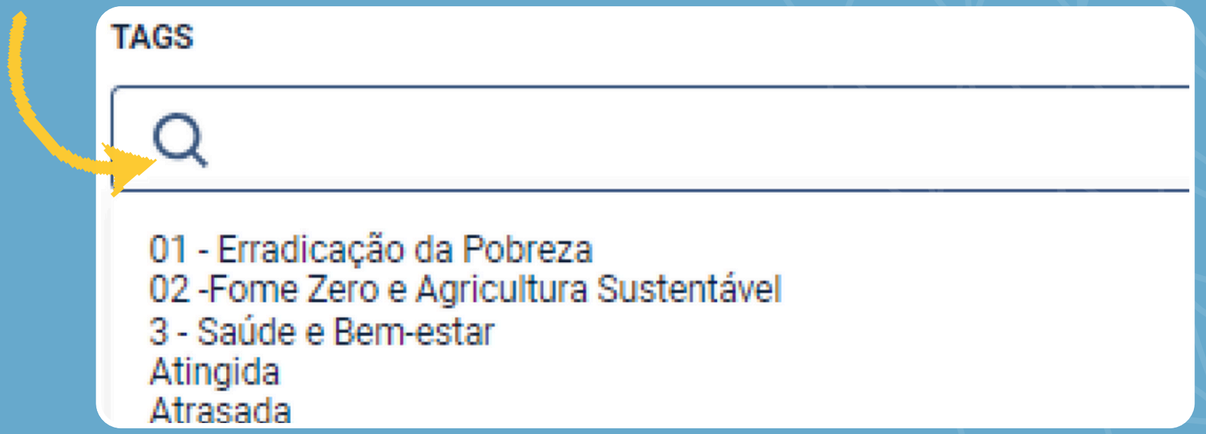
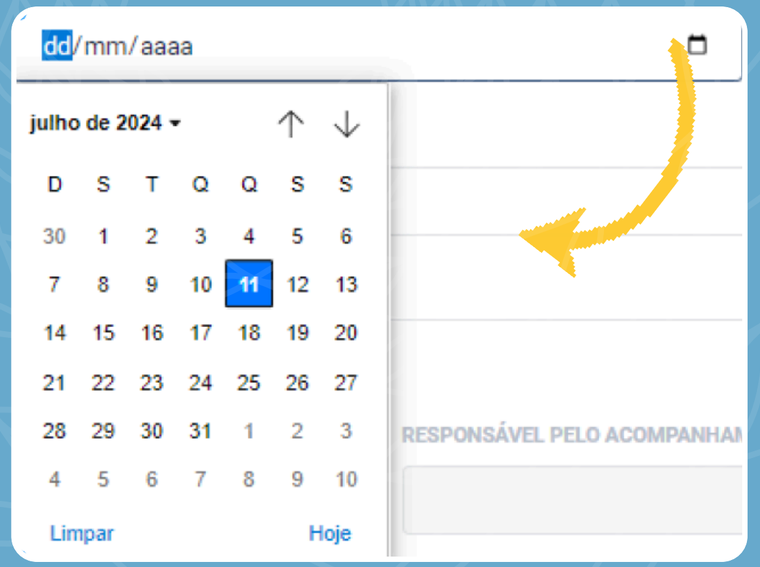
# Glossário de ícones

BAIXAR DOCUMENTOS




Selecione os seguintes ícones se desejar fazer "***Download***" de documentos e informações.







Alguns arquivos podem ser apenas baixados e outros baixados e salvos no sistema.

# ACESSANDO A PLATAFORMA - LOGIN




**01**

**ABRA SEU NAVEGADOR**

Digite na barra de pesquisa o link:

***smae.prefeitura.sp.fgv.br***




**02**

**EFETUE O LOGIN**

Efetue seu login com a senha enviada para seu e-mail. Troque-a no primeiro acesso. Caso não a possua, entre em contato com o Administrador do **SMAE** pelo o e-mail abaixo:

***smae.prefeitura.sp.fgv.br***

# E se eu esquecer a minha senha?

Caso tenha esquecido sua senha, é possível realizar a troca por uma nova acessando a opção “**Esqueci minha senha**”.

Insira o seu email para envio de uma nova senha temporária de acesso.

Assim que efetuar acesso com a nova senha disponibilizada será necessário criar uma nova senha para uso normal da plataforma.

01




02





03




# Perfil com Acesso ao Módulo

GESTÃO DE PROJETOS

Será exibido as opções de módulos conforme a permissão de acesso do perfil.

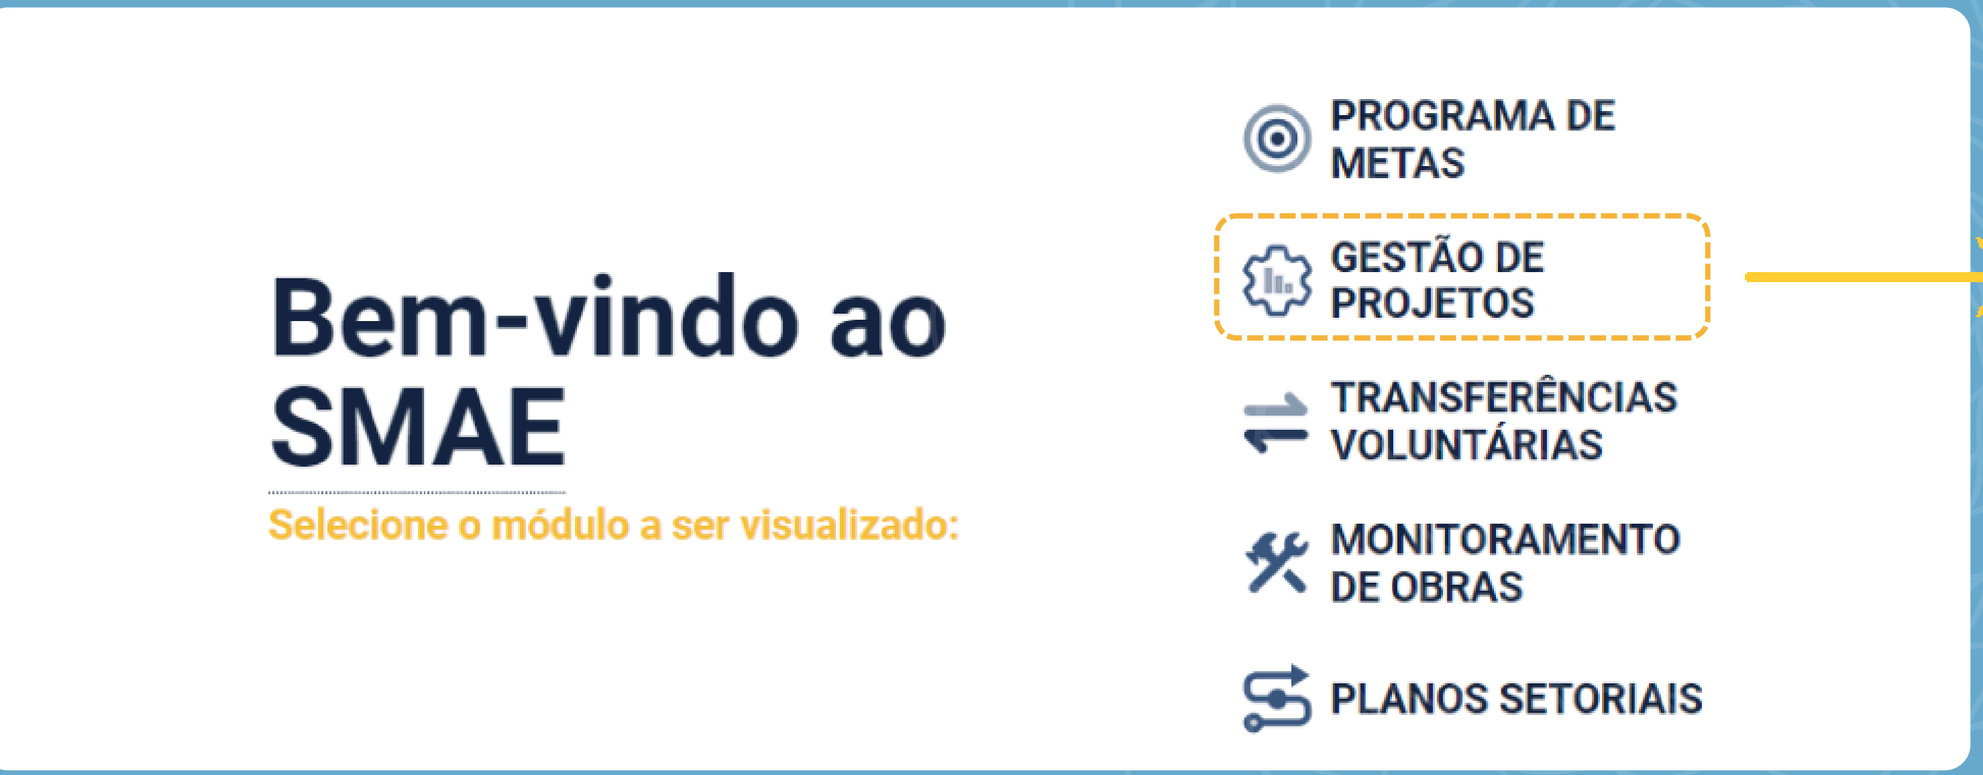

# PRIMEIROS PASSOS

## Cadastro de portfólio e projeto

Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Estratégico

SMAE

SMAE.PREFEITURA.SP.FGV.BR

# Definições importantes

## Portfólios

Dentro do módulo de Gestão de Projetos existem portfólios, que funcionam como pastas para organizar a carteira de projetos.

Portfólios também limitam o acesso de usuários à projetos de sua secretaria.

## Nível de regionalização

Define a localização da obra.

Níveis possíveis de regionalização:

- Município
- Região
- Subprefeitura
- Distrito

## Aninhamento de tarefas


Define a quantidade de níveis dos cronogramas das obras dentro de um portfólio.

Exemplos de numeração de atividades possível para:

- nível máximo 1 : 1, 2, 3, ...
- nível máximo 2 : 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1 ...
- nível máximo 3 : 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2 ...

# Configurações

CADASTRAMENTO DE PORTFÓLIOS




**01**

Em seu primeiro acesso ao módulo de Gestão de Projetos, acesse a página de portfólios, que se encontra dentro das “**Configurações**” no menu lateral.


**Atenção!**

Cadastro de portfólio não está disponível para todos os usuários. Para instruções de cadastro de projeto, por favor vá para o passo número 4.

**02**

Esta página exibirá todos os portfólios registrados e permitirá que alterações e exclusões sejam feitas. Uma vez acessada, você poderá criar portfólios clicando no botão no canto superior direito.

Projetos só podem ser cadastrados se forem alocados a portfólios existentes, portanto é importante completar esse passo antes de tentar cadastrar um projeto.

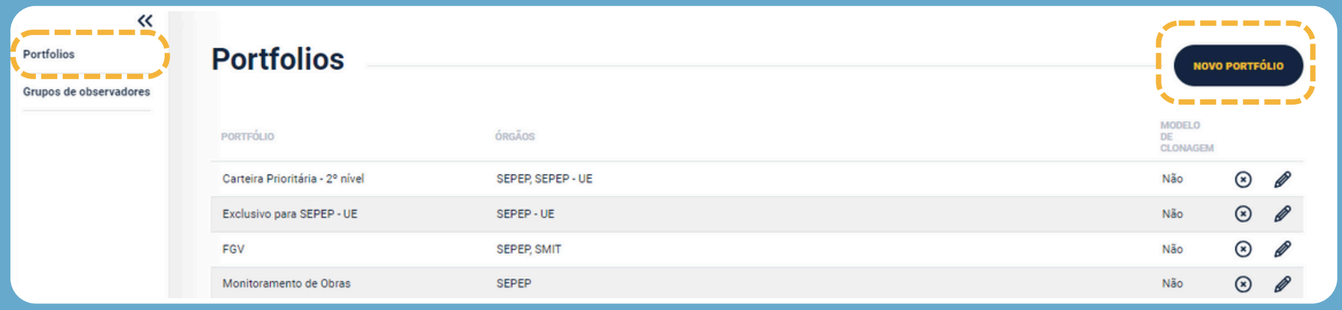

# Configurações

CADASTRAMENTO DE PORTFÓLIOS




**03**

Preencha todos os campos necessários para criar um novo portfólio. Lembre-se de indicar os meses para os quais poderá haver informações de execução orçamentária nos projetos. Clique em "Salvar" para que o portfólio seja criado.


Atenção ao checkbox de "Modelo de clonagem", marque-o somente para incluir nesse portfólio projetos com a finalidade de modelos de cronogramas para serem clonados em outros projetos, sem que os projetos desse portfólio interfiram nos relatórios gerenciais.

**Atenção!**

Os órgãos selecionados aqui são proprietários do portfólio e poderão ser escolhidos como gestor de portfólio de um projeto desse portfólio.

# Painel de Projetos

LISTA DE PROJETO





**04**

Depois de cadastrar um portfólio, acesse o "**Painel de Projetos**" no menu lateral.

**05**


Esta página exibirá todos os projetos cadastrados, e permitirá que alterações e exclusões sejam feitas. Você poderá cadastrar um novo projeto clicando no botão no canto superior direito.

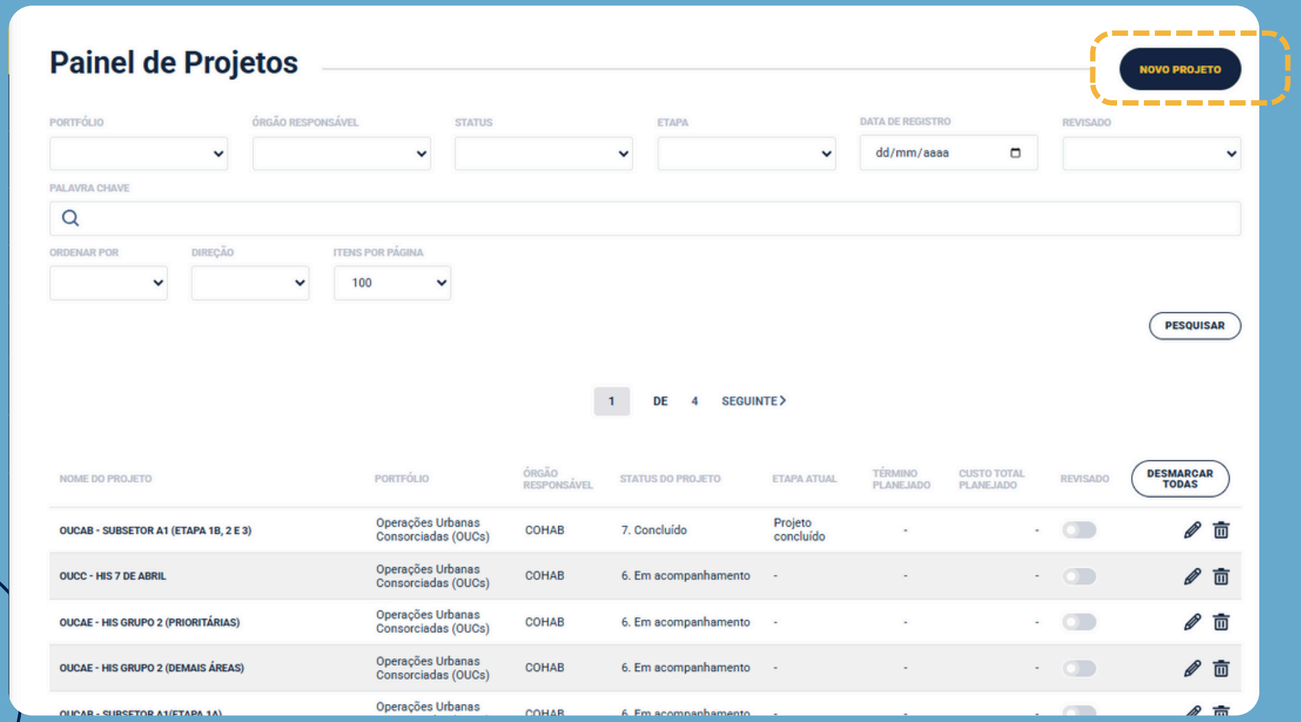

# Painel de Projetos

CADASTRO DE PROJETO

**06** Selecione o portfólio onde o projeto será inserido

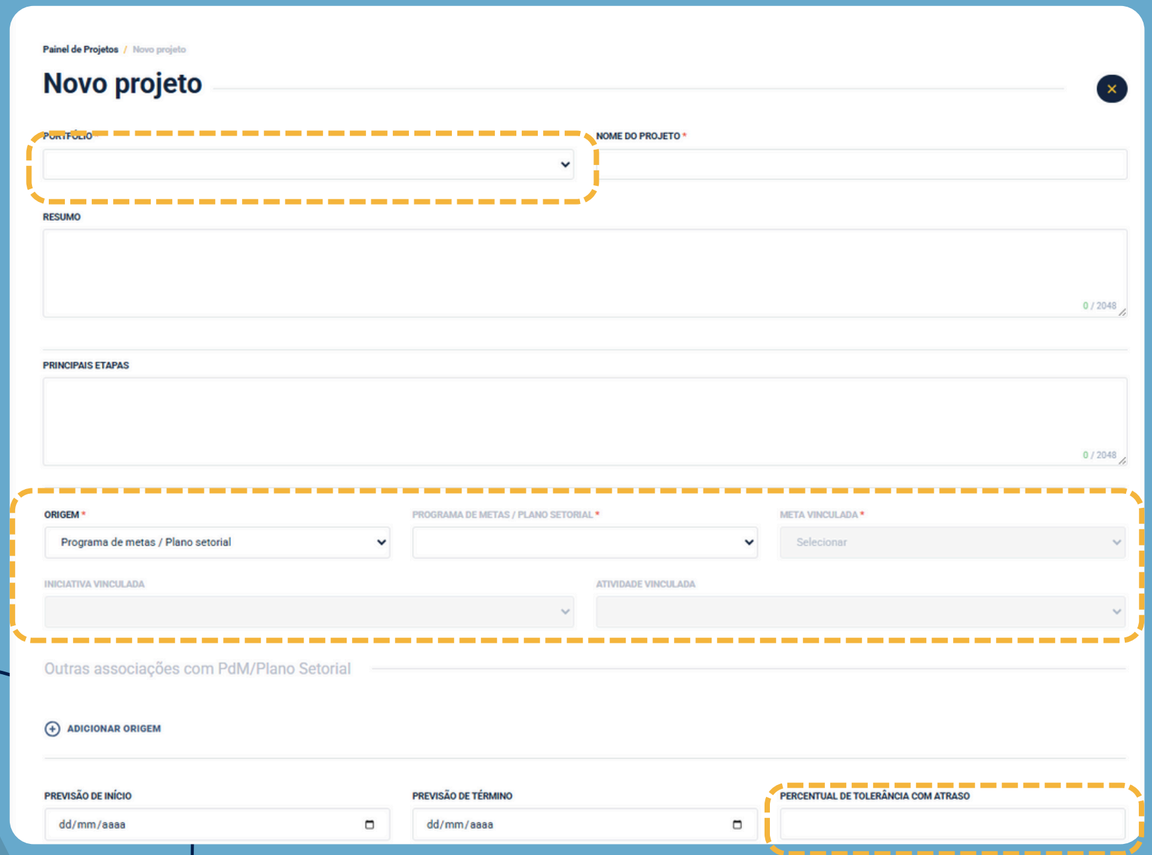



**07** Selecione a origem do projeto. Os campos apresentados dependem do tipo de origem selecionado na lista “origem”. Essa informação fará parte do código gerado pelo sistema para esse projeto.
Se o projeto tiver outros vínculos com metas de PdMs e/ou Plano Setorial eles podem ser cadastrados clicando em “+ adicionar origem”

**08** Indique o percentual de tolerância para o sistema considerar atraso no cronograma. Se você indicar, por exemplo, 10%, o sistema vai sinalizar atraso no cronograma somente se houver atraso superior a 10%

# Cadastro de Projeto

CADASTRO DE PROJETO

**09** Escolha o órgão gestor do portfólio (restrito aos órgãos gestores do portfólio selecionado) e a pessoa que será responsável - ela terá acesso irrestrito ao projeto. A seguir escolha o órgão que será responsável pela execução do projeto e a pessoa responsável - ela terá restrições de acesso de escrita após o inicio do projeto.

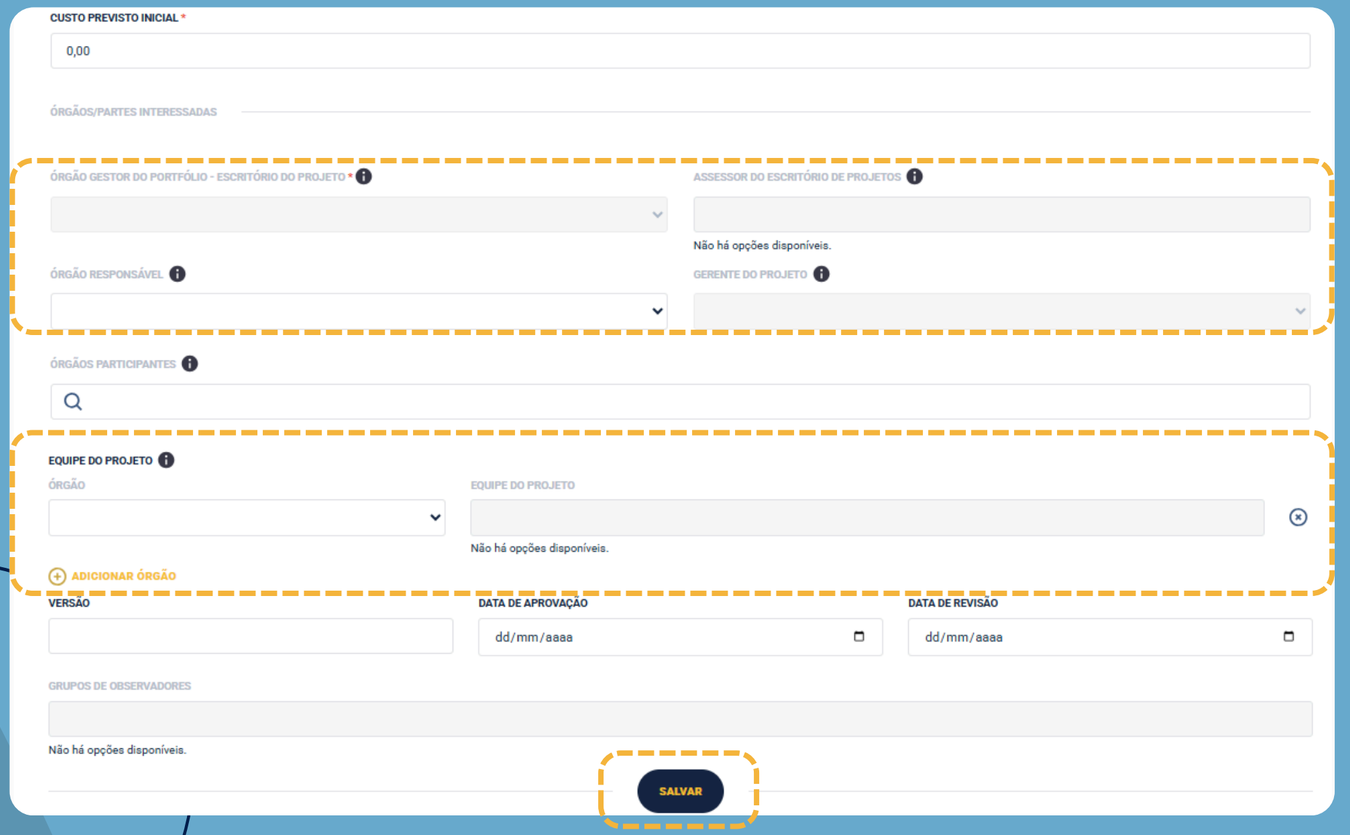


**10** Escolha o(s) órgãos e respectivas pessoas responsáveis que contribuirão para os registros de dados do projeto no sistema. Elas terão restrições de acesso de escrita após o inicio do projeto.


**Atenção!**

As pessoas apresentadas nas listas de “assessor do escritório de projetos”, “gerente do projeto” e “equipe do projeto” dependem do órgão selecionado e dos perfis de acesso da pessoa.

# Painel de Projetos

LISTA DE PROJETO

**08** Voltando a lista de portfólios, você pode usar os filtros para facilitar a sua busca pelo projeto, trocar a ordem das linhas e definir a quantidade de linhas por página.

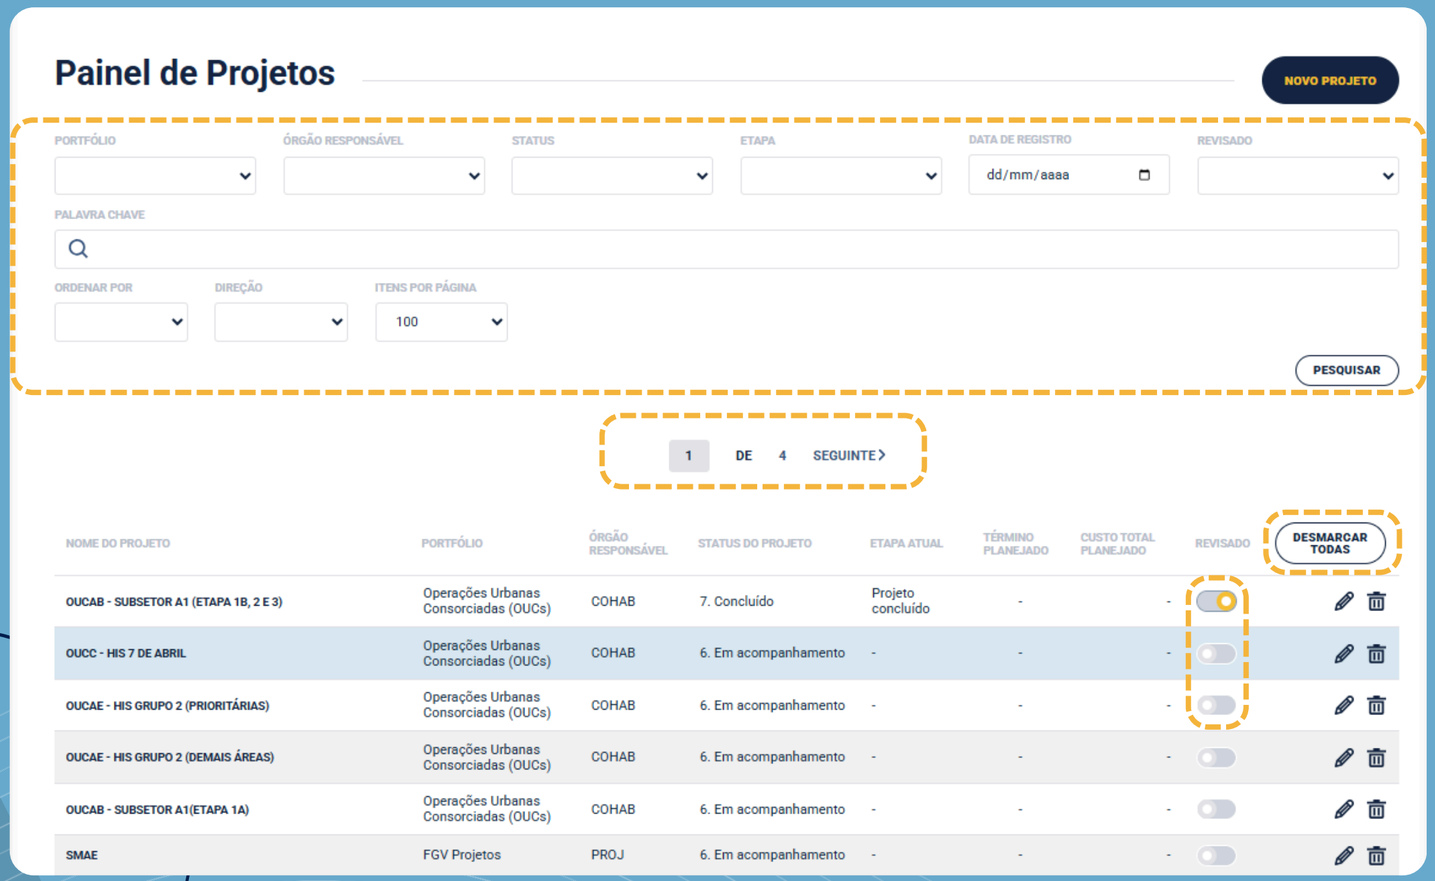


**09** Utilize o navegador de páginas para ir para a próxima página da lista ou voltar para a página anterior.

**10** Deslize a chave na coluna “revisado” para marcar/desmarcar o projeto como revisto. Utilize o botão “desmarcar todas” para limpar a marcação de todos de um só vez.
O projeto recém visitado é apresentado com fundo azul. Tanto a marcação de revisado quanto do último projeto visitado é pessoal, outros usuários verão somente suas próprias marcações.

# PROJETO

Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Estratégico


SMAE

SMAE.PREFEITURA.SP.FGV.BR

# Painel de Projetos

FLUXO DO PROJETO

A "vida" de um projeto é dividido por etapas e fases, as quais auxiliam no entendimento do momento em que o projeto se encontra.

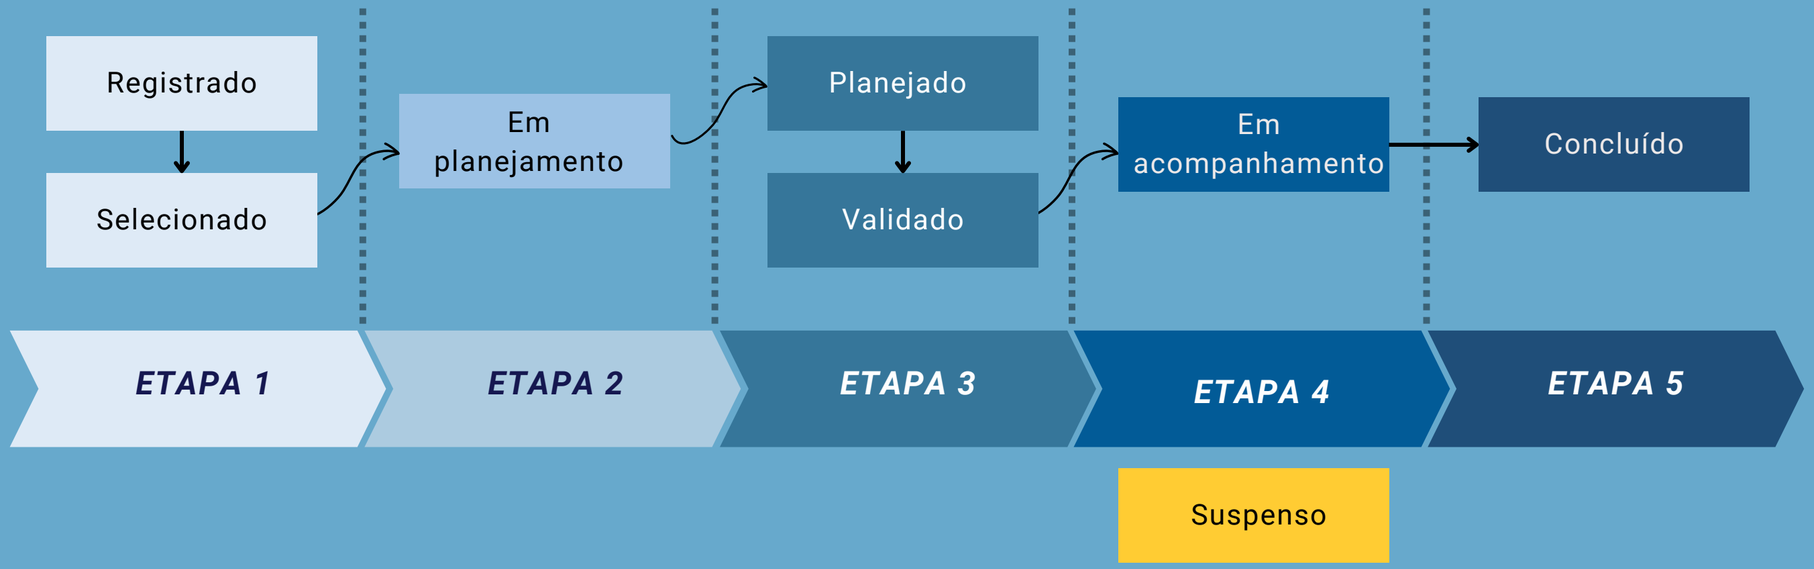


Um projeto “nasce” com a situação de “registrado” e segue a ordem do fluxo, percorrendo todas as etapas.
Ele  pode ser suspenso  interrompendo esse fluxo.

# Portfólios

CADASTRO DE PROJETO

Após a inclusão do projeto os seguintes campos se tornam disponíveis para preenchimento:

- Compartilhar com portfólio - permite que você compartilhe esse projeto com outro portfólio desde que esse portfólio tenha órgão gestor comum com o portfólio deste projeto.
- Objeto e Objetivo
- Premissas e Restrições
- Fontes de recursos
- Não escopo
- Localização

Quando o projeto passar para a situação de “selecionado” o campo público-alvo será habilitado para edição

As pessoas indicadas como gerente do projeto ou como parte de equipe do projeto terão acesso à edição do projeto até a fase de planejamento.

# Painel de Projetos

PROJETO - ESCOPO





Na lista de portfólios, clique sobre o nome do projeto para abri-lo.

O SMAE apresenta um menu secundário com as funcionalidades de um projeto.

Essa funcionalidade de escopo apresenta os dados de cadastro do projeto.

Para editar o projeto clique no botão “editar” no canto direito. (o ícone do lápis na lista é um atalho para abrir o editor)

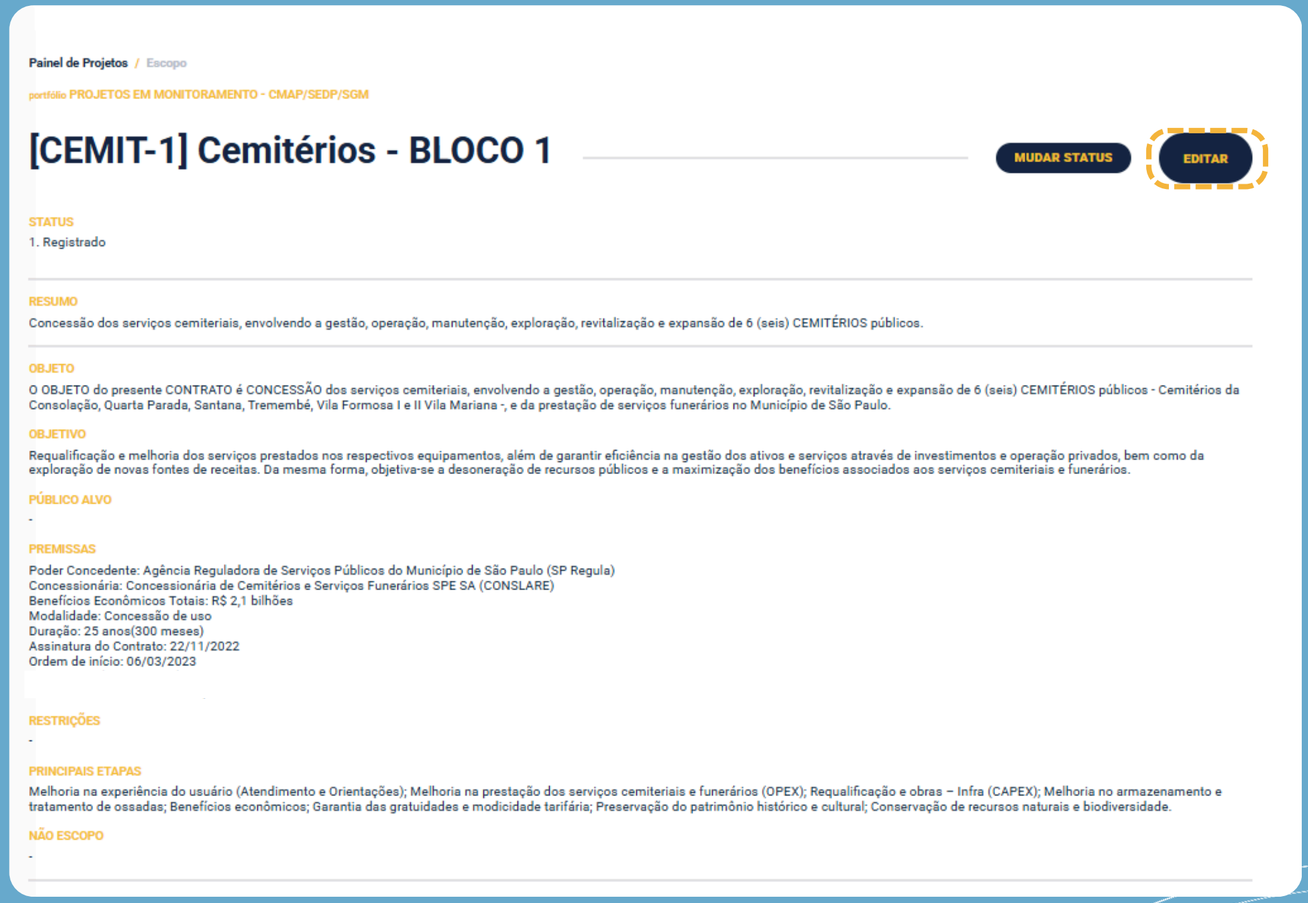

# Painel de Projetos

PROJETO - LOCALIZAÇÃO

Para incluir um endereço no projeto, navegue até o campo "**Localização**" na tela de edição do projeto.

Clique no botão "**Adicionar Endereço**". Isso abrirá um modal no topo da tela atual.




# Painel de Projetos

PROJETO - LOCALIZAÇÃO


Na modal de registro de endereço, comece digitando no campo "termo de busca" o nome do logradouro desejado.

O campo "Rótulo para marcador" serve para nomear a localização.

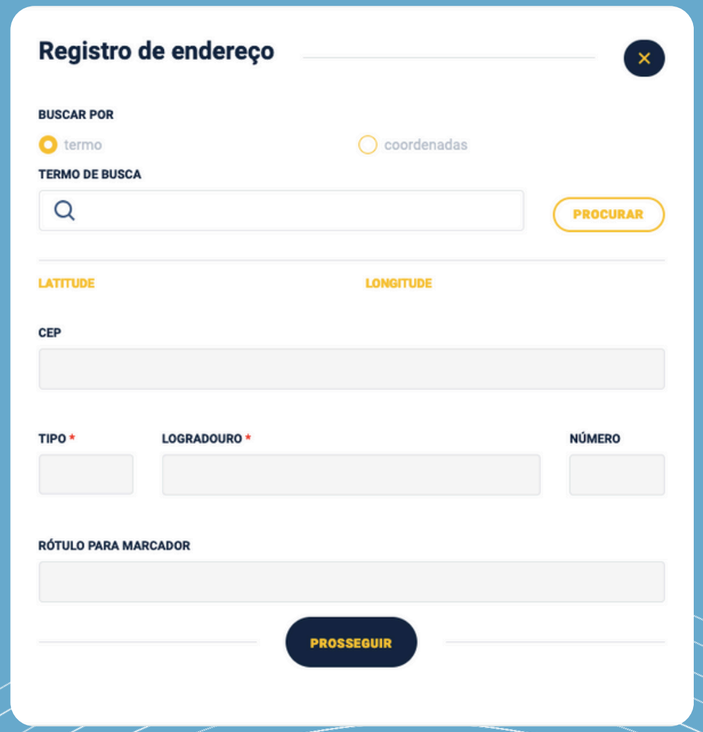


Os resultados da busca aparecerão embaixo desse campo para que seja selecionado o correspondente ao projeto. É possível clicar e arrastar no *pin* dentro do mapa e o endereço é recalculado.

Preencha os campos restantes na parte inferior da modal, e clique em "**prosseguir**" para adicionar esta localização.

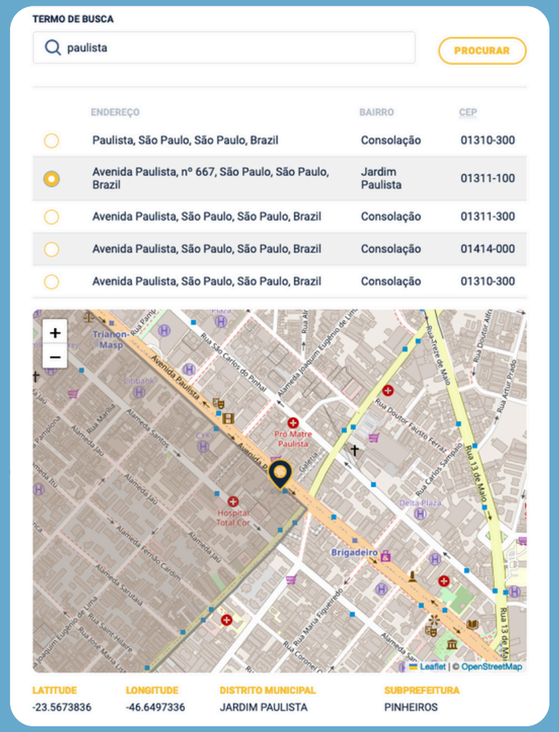

# Painel de Projetos


PROJETO - LOCALIZAÇÃO

Projetos com enderecos cadastrados terão um mapa exibindo os pontos na tela de escopo do projeto.

NÃO ESCOPO

-

LOCALIZAÇÃO

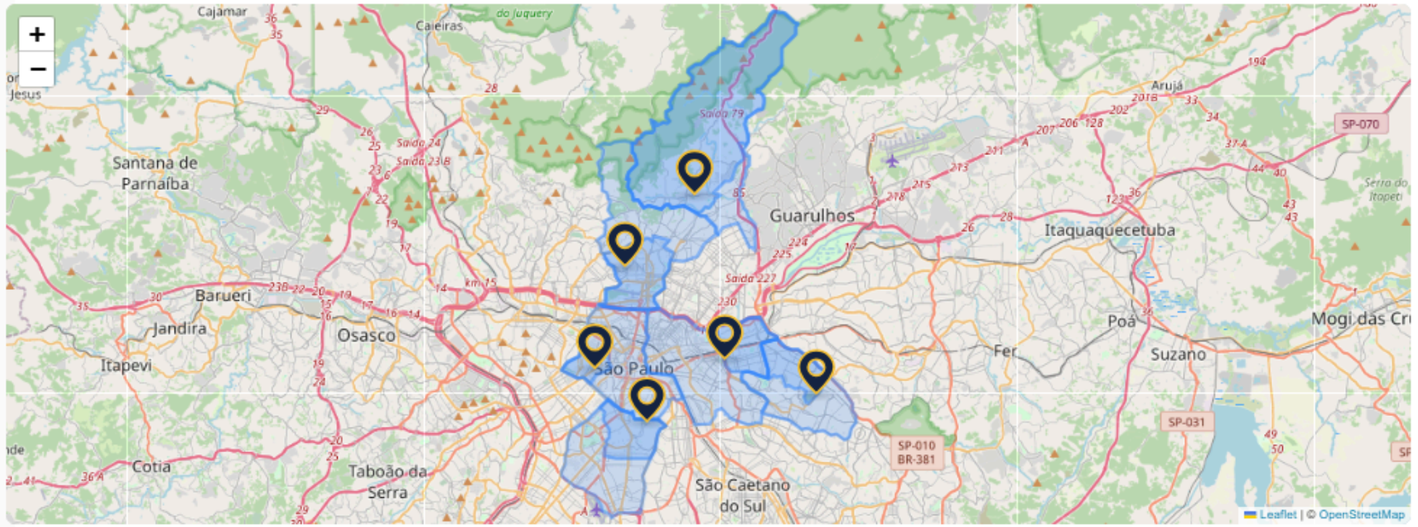




**Fontes de recursos**

# Portfólios

PROJETO - MUDANÇA DE STATUS DO FLUXO

Para avançar o projeto no fluxo clique em “mudar status” na tela de escopo ou na tela de edição do projeto.
Serão apresentados as “movimentações” possíveis no momento.
Selecione o status desejado.



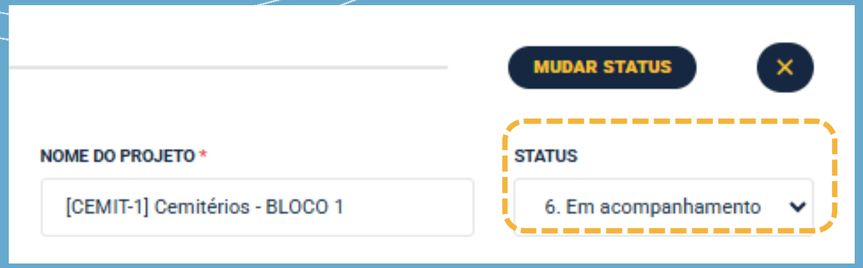
É possível voltar no fluxo no campo “status” na tela do editor do projeto .


O código do projeto será gerado quando ele passar para a fase de planejamento. Esse código tem um formato padrão: órgão.ano.meta. Onde:

- órgão = responsável pela execução do projeto
- ano = ano no qual o projeto iniciou planejamento
- meta = se for uma meta do PDM M+código da meta, senão MOO00
- sequencial = sequencial no ano por portfólio

# Painel de Projetos

CRONOGRAMA

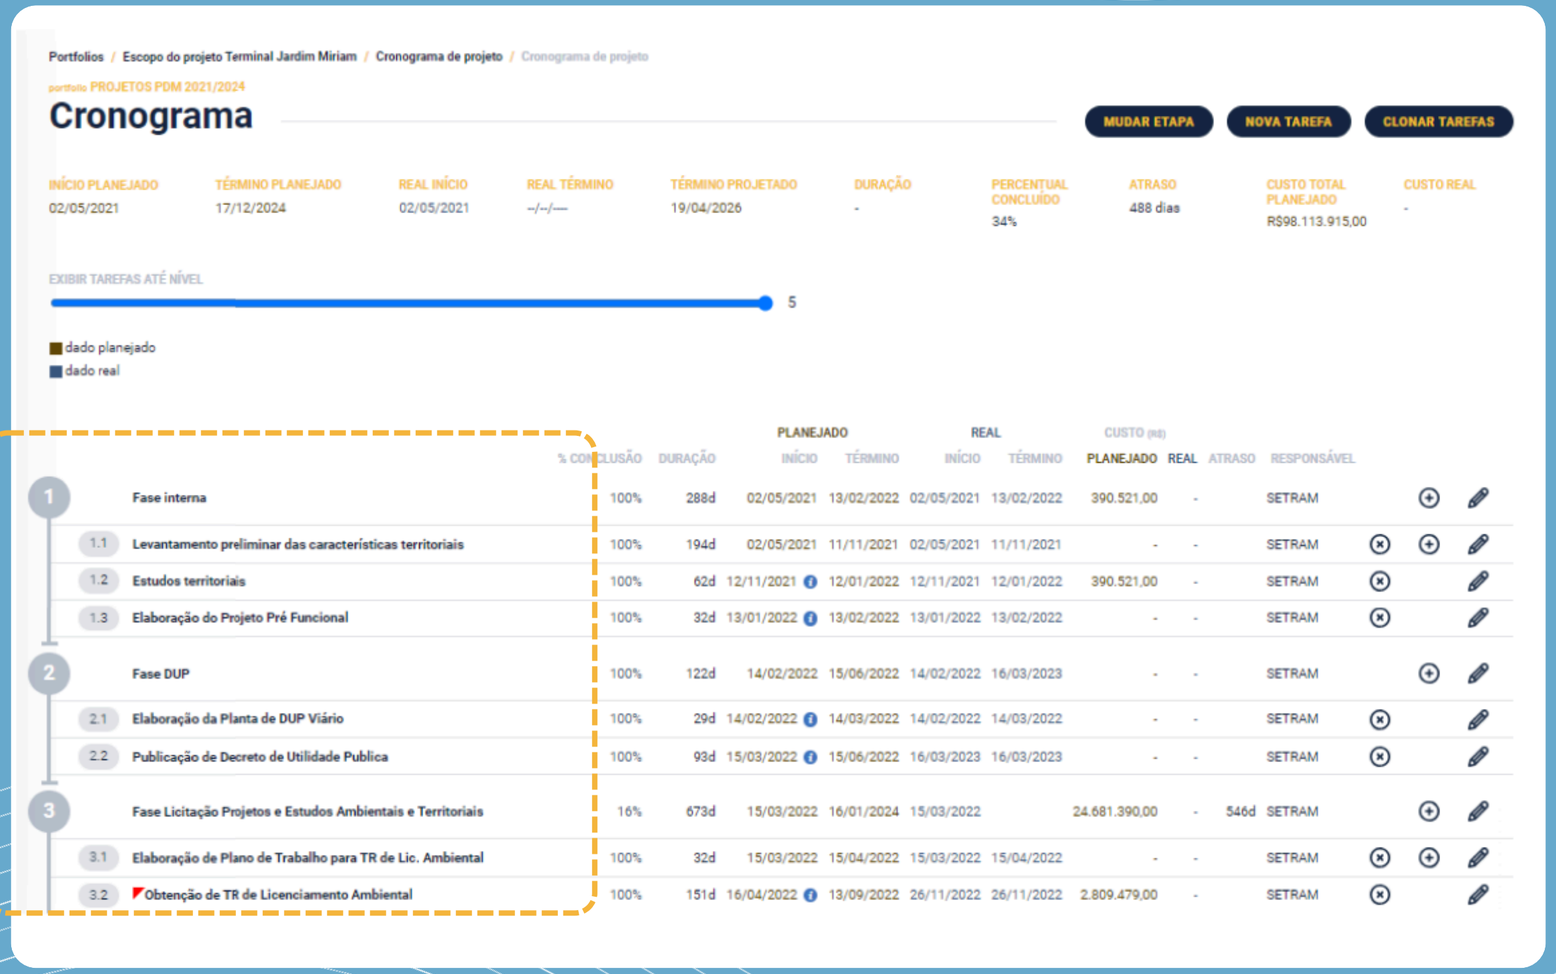


O cronograma trata do planejamento e acompanhamento de execução física e financeira do projeto.


As tarefas do cronograma podem ser subdivididas em tarefas menores, estabelecendo uma hierarquia entre elas.

A quantidade de níveis hierárquicos (quebras) permitidos é definida na configuração do portfólio.

# Painel de Projetos

CRONOGRAMA

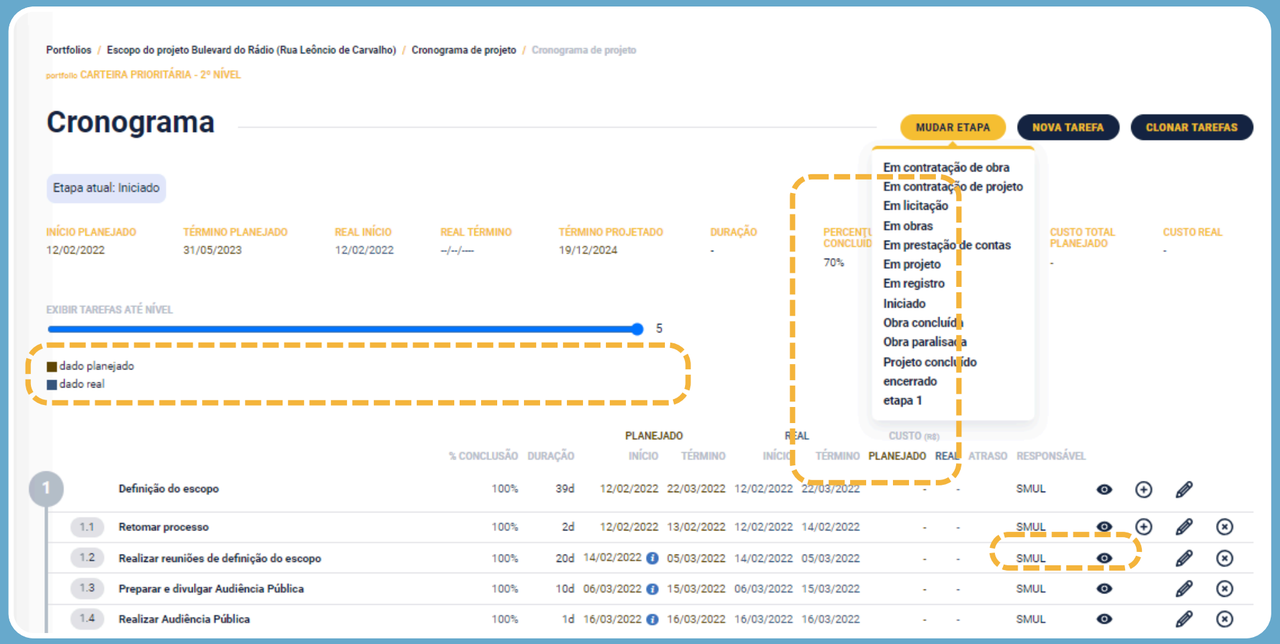


A pessoas indicadas como gerente do projeto e participantes de equipe terão acesso à edição do cronograma até a fase de planejamento. Finalizado o planejamento, somente o assessor do escritório de projetos terá permissão de acesso para edição da estrutura e dos dados de previsão, sendo permitida a consulta aos demais. Na fase de acompanhamento do projeto, tanto o gerente quanto os participantes das equipes podem informar a execução física e financeira do cronograma.

Clique no botão "Mudar etapa" para escolher a situação atual do cronograma do projeto.


Deslize a barra azul para escolher quantos níveis hierárquicos do cronograma são exibidos, por padrão são exibidos todos os níveis.

O resumo da tarefa pode ser acessado clicando no ícone de olho na lateral direita.

# Painel de Projetos

CRONOGRAMA

Observe a numeração de cada tarefa e perceba como elas formam uma hierarquia (sempre começa com a numeração da tarefa mãe).

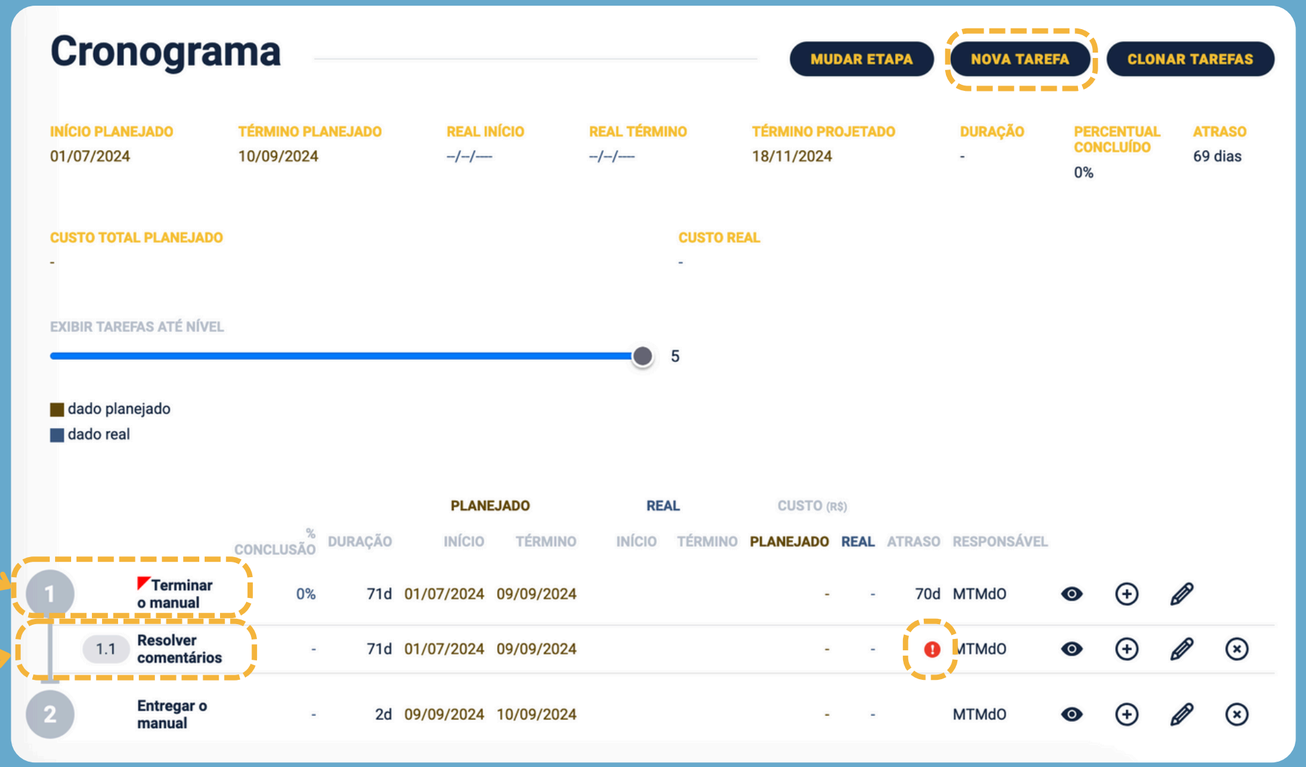


**Tarefa mãe**

**Tarefa filha**


Clique em **“nova tarefa”** para incluir registro.

Tarefas com o canto superior esquerdo do nome em vermelho indicam que a tarefa é um marco do projeto.

Tarefas com vencimento previsto na data corrente tem o ícone de **“!”** vermelho na coluna de atraso

# Painel de Projetos

CRONOGRAMA

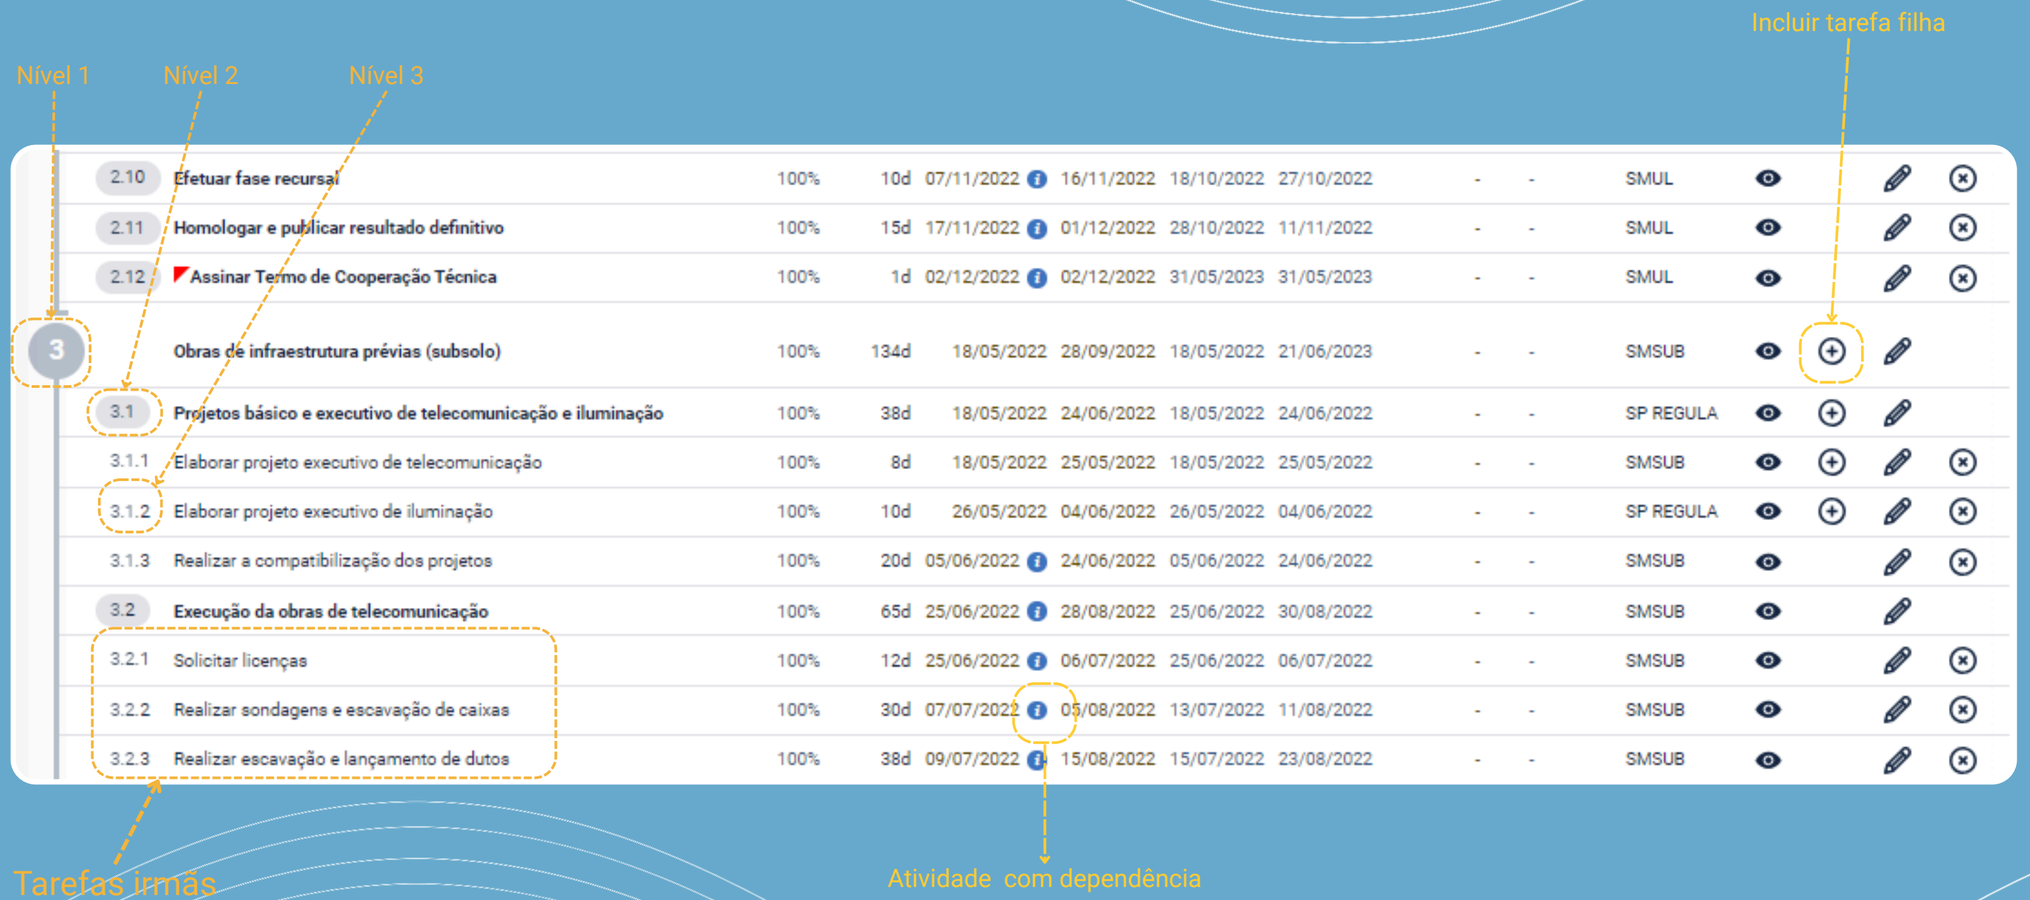



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | **Efetuar fase recursal** | 100% | 10d | 07/11/2022 | 16/11/2022 | 18/10/2022 | 27/10/2022 | - | - | SMUL | | | | |
| 2.11 | **Homologar e publicar resultado definitivo** | 100% | 15d | 17/11/2022 | 01/12/2022 | 28/10/2022 | 11/11/2022 | - | - | SMUL | | | | |
| 2.12 | **Assinar Termo de Cooperação Técnica** | 100% | 1d | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | - | - | SMUL | | | | |
| 3 | **Obras de infraestrutura prévias (subsolo)** | 100% | 134d | 18/05/2022 | 28/09/2022 | 18/05/2022 | 21/06/2023 | - | - | SMSUB | | | | |
| 3.1 | **Projetos básico e executivo de telecomunicação e iluminação** | 100% | 38d | 18/05/2022 | 24/06/2022 | 18/05/2022 | 24/06/2022 | - | - | SP REGULA | | | | |
| 3.1.1 | Elaborar projeto executivo de telecomunicação | 100% | 8d | 18/05/2022 | 25/05/2022 | 18/05/2022 | 25/05/2022 | - | - | SMSUB | | | | |
| 3.1.2 | Elaborar projeto executivo de iluminação | 100% | 10d | 26/05/2022 | 04/06/2022 | 26/05/2022 | 04/06/2022 | - | - | SP REGULA | | | | |
| 3.1.3 | Realizar a compatibilização dos projetos | 100% | 20d | 05/06/2022 | 24/06/2022 | 05/06/2022 | 24/06/2022 | - | - | SMSUB | | | | |
| 3.2 | **Execução da obras de telecomunicação** | 100% | 65d | 25/06/2022 | 28/08/2022 | 25/06/2022 | 30/08/2022 | - | - | SMSUB | | | | |
| 3.2.1 | Solicitar licenças | 100% | 12d | 25/06/2022 | 06/07/2022 | 25/06/2022 | 06/07/2022 | - | - | SMSUB | | | | |
| 3.2.2 | Realizar sondagens e escavação de caixas | 100% | 30d | 07/07/2022 | 05/08/2022 | 13/07/2022 | 11/08/2022 | - | - | SMSUB | | | | |
| 3.2.3 | Realizar escavação e lançamento de dutos | 100% | 38d | 09/07/2022 | 15/08/2022 | 15/07/2022 | 23/08/2022 | - | - | SMSUB | | | | |

Somente as tarefas que não possuem tarefas filhas podem ter dependências.

# Painel de Projetos

CRONOGRAMA

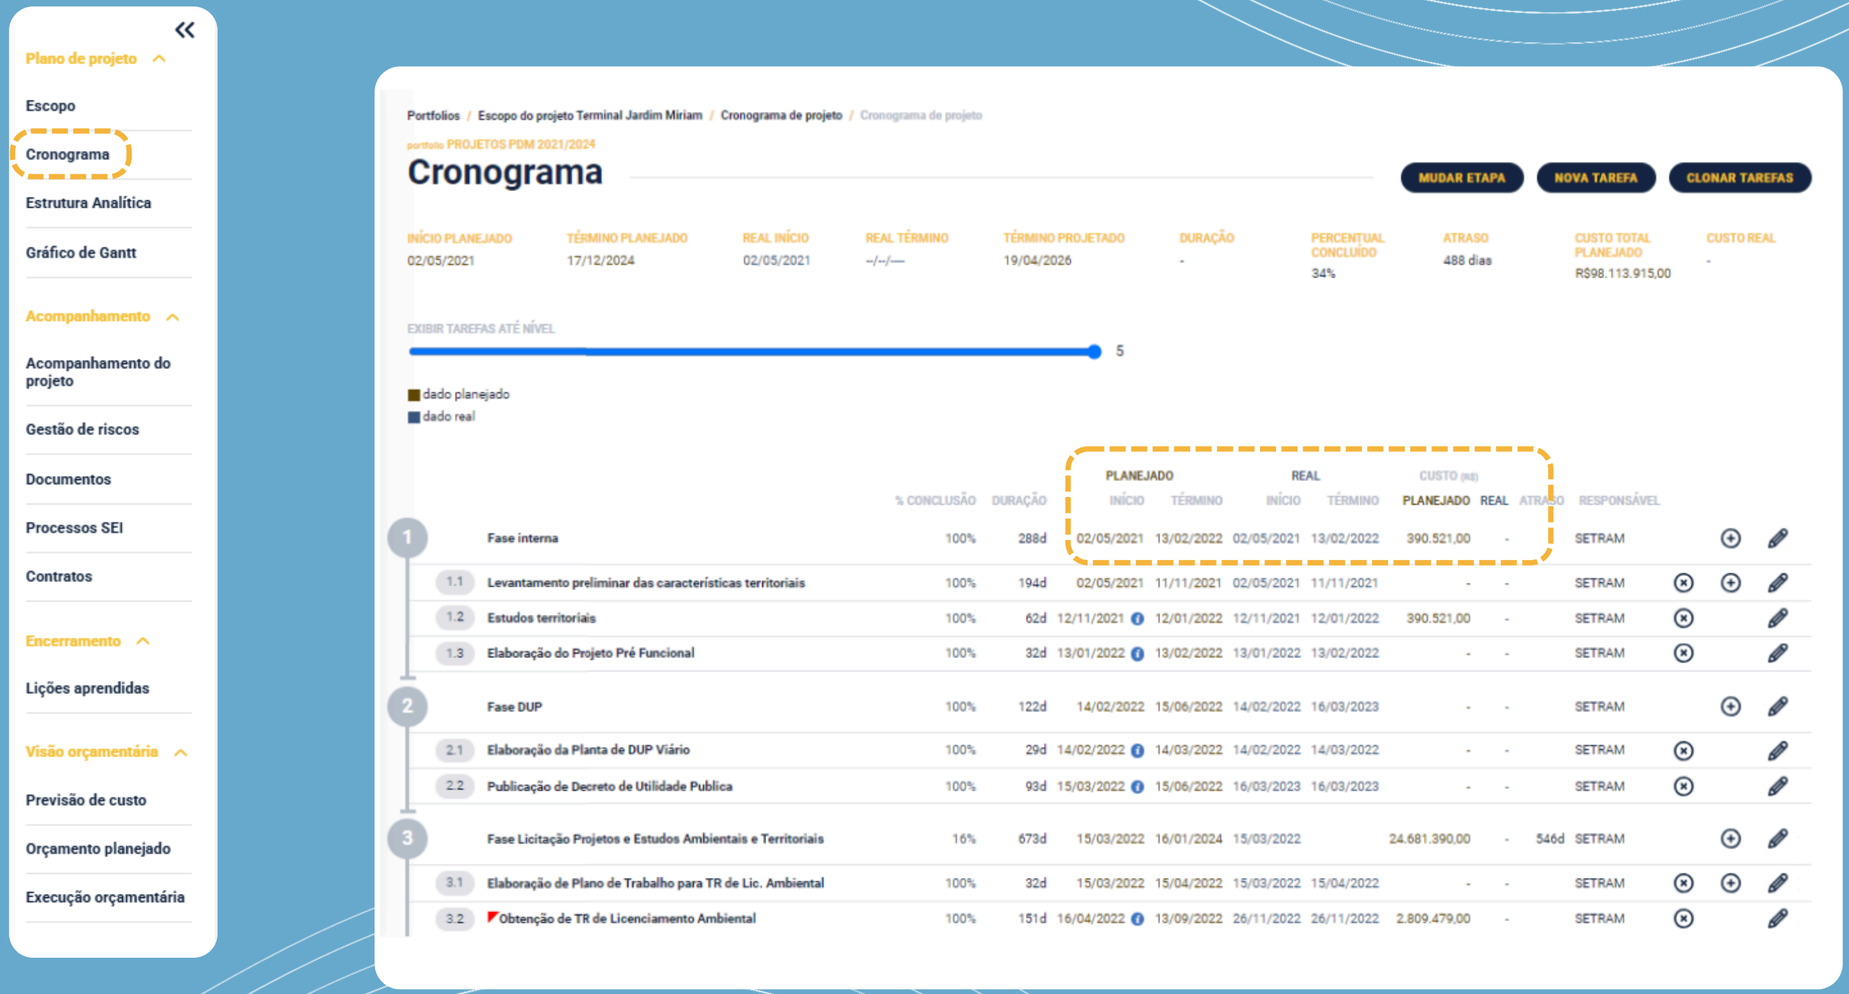



Tanto as datas de início e término quanto os custos previstos e realizados de níveis superiores serão calculadas automaticamente com base nos níveis inferiores, caso existam.

O calculo do % concluído das tarefas mãe e do cronograma como um todo utiliza como ponderador a duração das tarefas que a compõem.

# Painel de Projetos

CRONOGRAMA - CLONAGEM

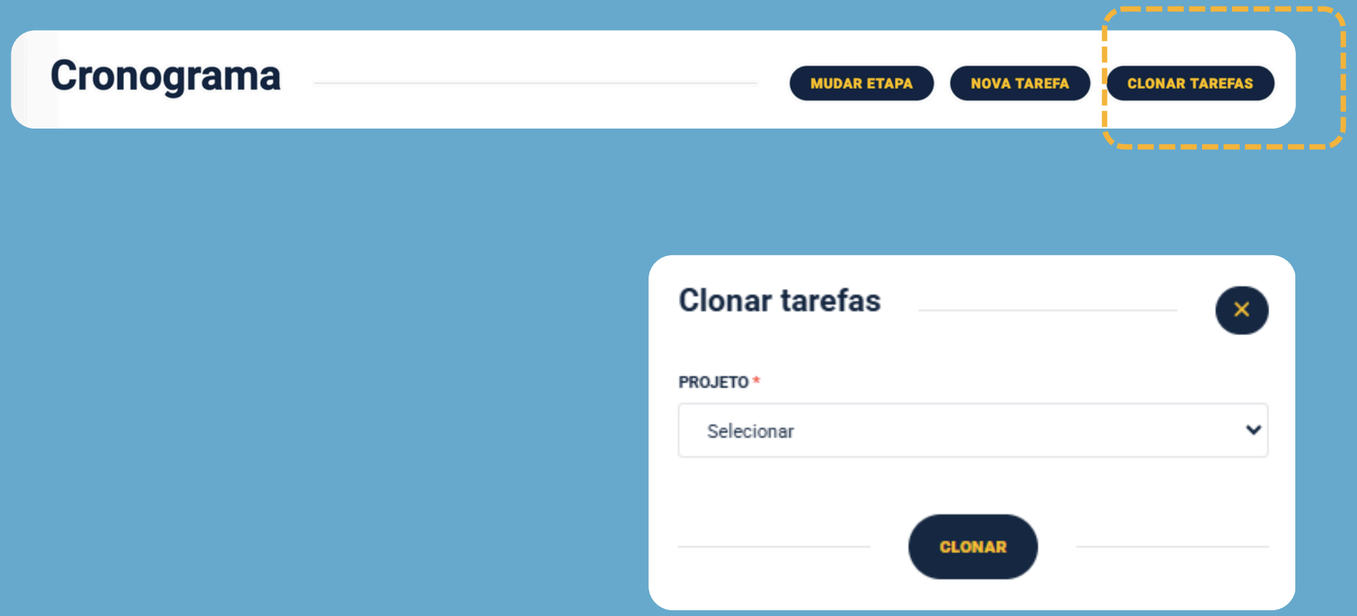


Se quiser copiar a estrutura de um cronograma de outro projeto clique em **“clonar tarefas” .**

Escolhe o projeto que contém o cronograma de origem.

Somente os projetos aos quais você tem permissão de acesso e que são de portfólios do mesmo órgão deste projeto são listados.

Após o clique em “clonar” o SMAE faz uma cópia de todas as tarefas, sua hierarquia, dependências e duração (as datas e custos não são copiados).


# Painel de Projetos

CRONOGRAMA

Marque a caixinha “marco do projeto?” se essa atividade for importante para o projeto.

Indique a tarefa mãe (se for uma tarefa de nível 1 deixe em branco)

Escolha ordem  dessa tarefa entre as tarefas irmãs (observe a lista de tarefas irmãs ser alterada caso voce coloque essa tarefa em uma posição já ocupada no meio delas) .

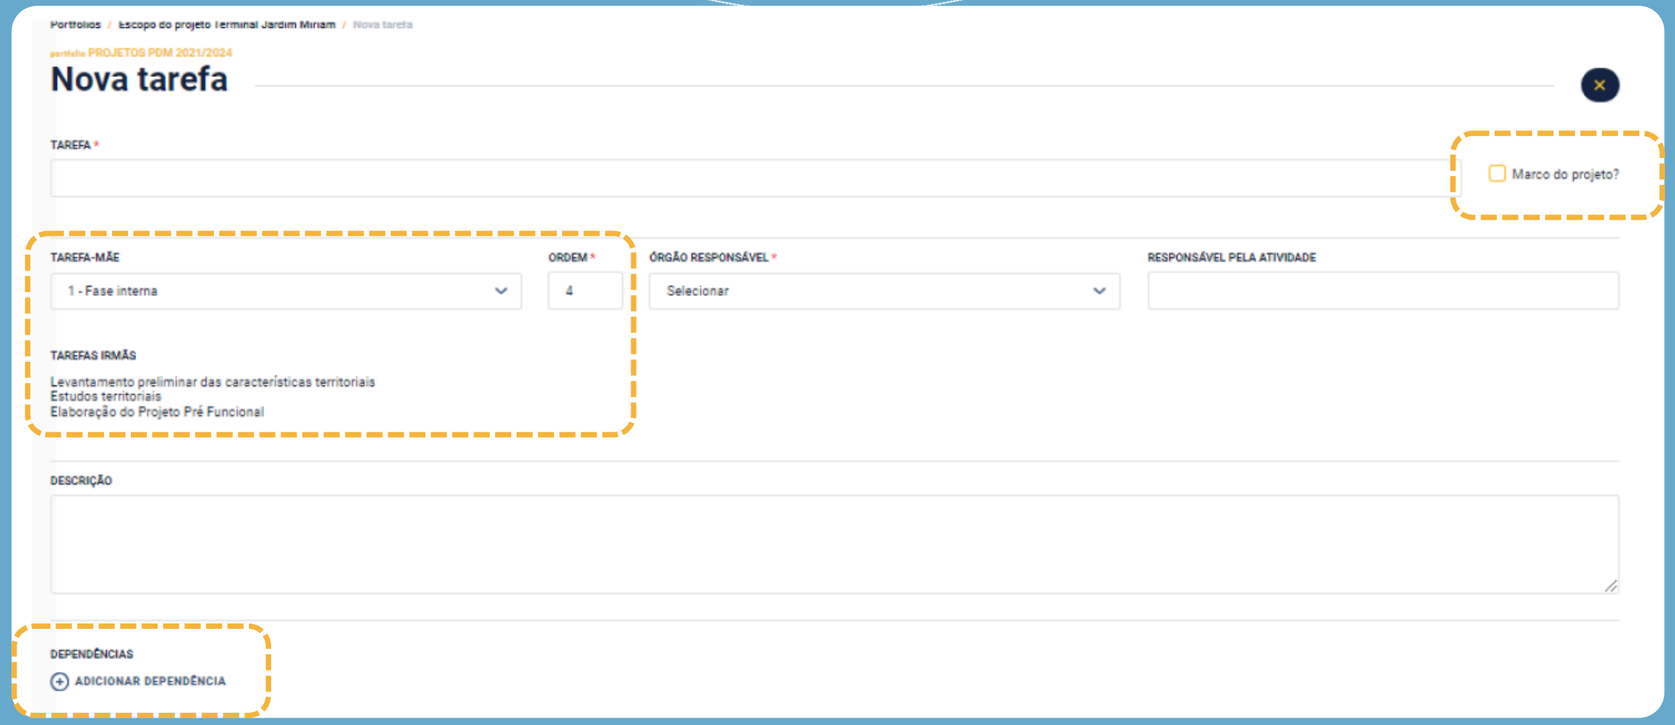



Caso essa tarefa dependa de outra, clique em “+ adicionar dependências”.

# Painel de Projetos


CRONOGRAMA

Selecione a tarefa da qual essa depende, escolha o tipo de dependência e os dias de latência. Caso precise excluir os campos preenchidos, clique no "**X**" no canto direito. Para incluir outras dependências clique novamente em "**adicionar dependência**". Não esqueça de clicar em "**validar dependência**" utilizando o botão do mesmo nome. Isso fará com que o sistema calcule as datas de inicio e/ou término pertinentes e verifique a existência de dependências circulares.

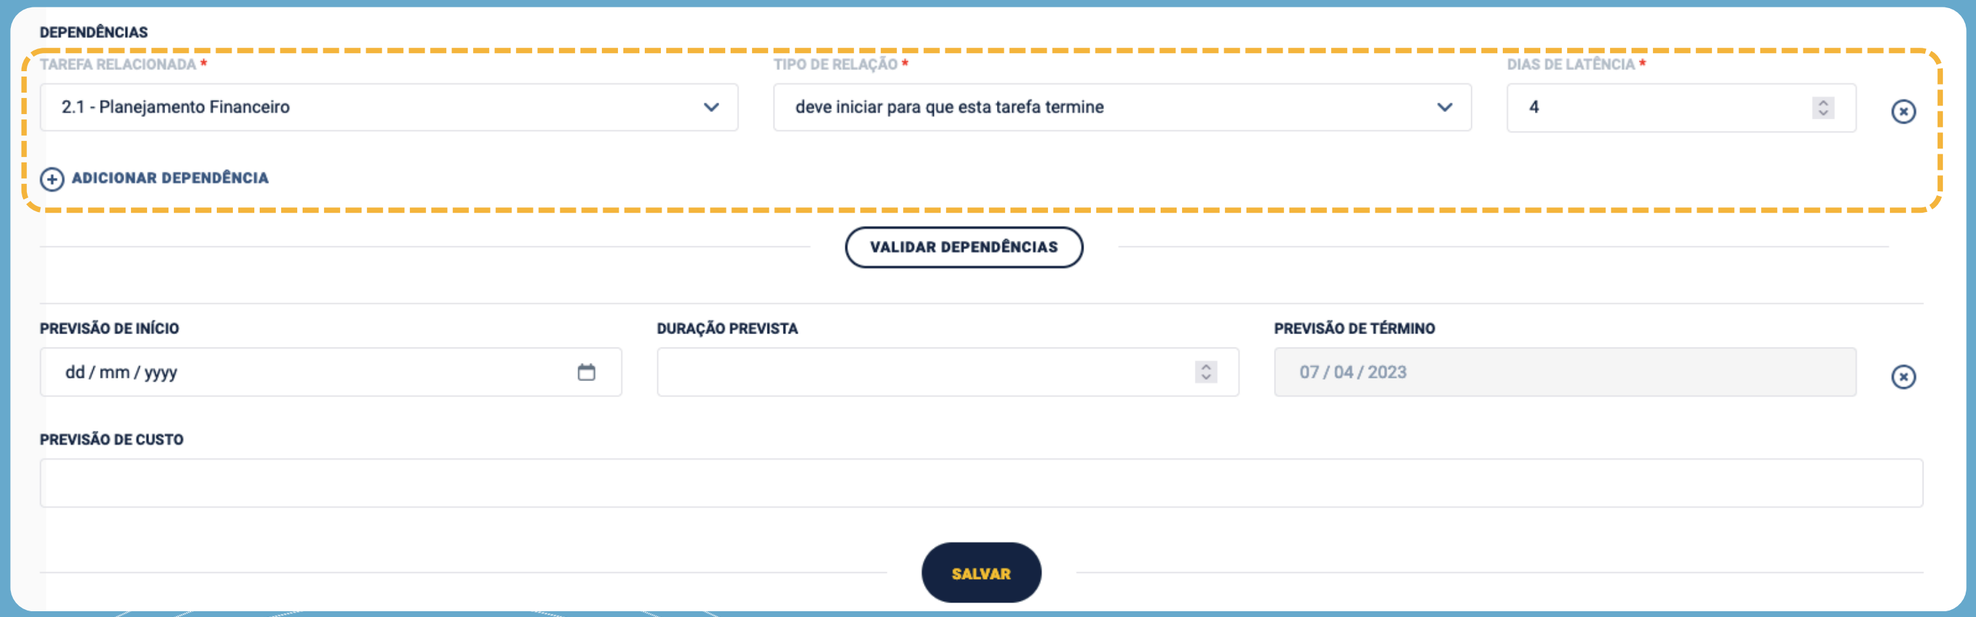


# Painel de Projetos

EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA

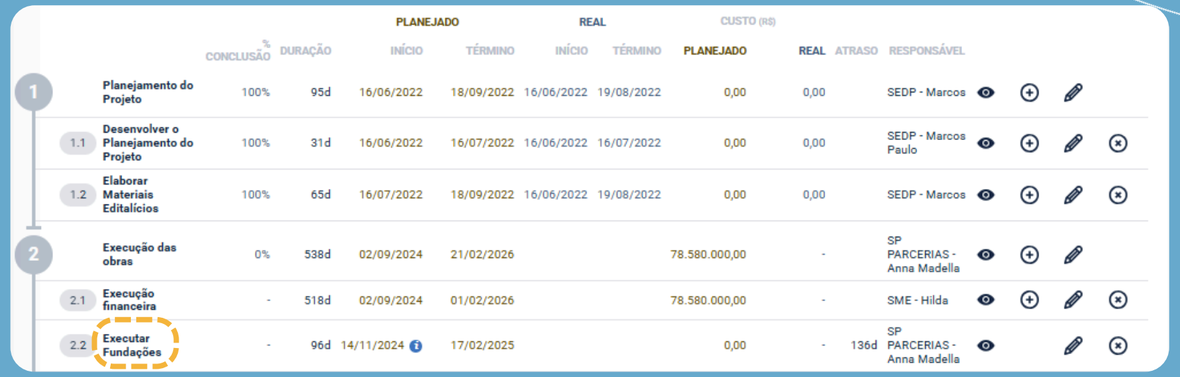

| | | | | PLANEJADO | | REAL | | CUSTO (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONCLUSÃO % | DURAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | PLANEJADO | REAL | ATRASO | RESPONSÁVEL |
| 1 | Planejamento do Projeto | 100% | 95d | 16/06/2022 | 18/09/2022 | 16/06/2022 | 19/08/2022 | 0,00 | 0,00 | | SEDP - Marcos |
| 1.1 | Desenvolver o Planejamento do Projeto | 100% | 31d | 16/06/2022 | 16/07/2022 | 16/06/2022 | 16/07/2022 | 0,00 | 0,00 | | SEDP - Marcos Paulo |
| 1.2 | Elaborar Materiais Editalícios | 100% | 65d | 16/07/2022 | 18/09/2022 | 16/06/2022 | 19/08/2022 | 0,00 | 0,00 | | SEDP - Marcos |
| 2 | Execução das obras | 0% | 538d | 02/09/2024 | 21/02/2026 | | | 78.580.000,00 | - | | SP PARCERIAS - Anna Madella |
| 2.1 | Execução financeira | - | 518d | 02/09/2024 | 01/02/2026 | | | 78.580.000,00 | - | | SME - Hilda |
| 2.2 | Executar Fundações | - | 96d | 14/11/2024 | 17/02/2025 | | | 0,00 | - | 136d | SP PARCERIAS - Anna Madella |

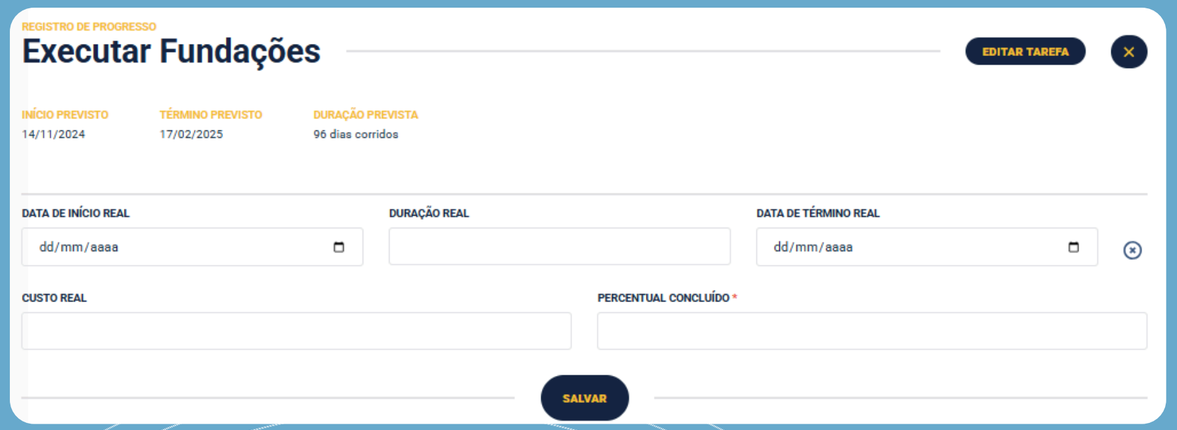

REGISTRO DE PROGRESSO

**Executar Fundações**

EDITAR TAREFA

| INÍCIO PREVISTO | TÉRMINO PREVISTO | DURAÇÃO PREVISTA |
|---|---|---|
| 14/11/2024 | 17/02/2025 | 96 dias corridos |

DATA DE INÍCIO REAL: dd/mm/aaaa

DURAÇÃO REAL

DATA DE TÉRMINO REAL: dd/mm/aaaa

CUSTO REAL

PERCENTUAL CONCLUÍDO *

SALVAR

Clique sobre o nome da tarefa para registrar o seu andamento.

Você deve informar periodicamente o percentual de conclusão e o custo já realizado para manter as informações mais próximas da realidade, até que a tarefa termine. Só assim você terá um cálculo mais preciso do atraso da tarefa e do projeto como um todo.

# Painel de Projetos

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO







A **"Estrutura Analítica do Projeto - EAP"** é uma representação gráfica do cronograma**.** Clique nos números para expandir os níveis exibidos.

Você pode mover a estrutura pela página, basta clicar sobre ela e arrastar.

# Painel de Projetos


GRÁFICO DE GANTT




O Gráfico de Gantt, que é a apresentação gráfica no tempo do Cronograma.


O **SMAE** apresenta três visões do cronograma: o planejamento, a realização e a projeção .


O click em uma tarefa indica graficamente o percentual executado e sinaliza as dependências entre tarefas "acendendo" as tarefas da qual ela depende.
Os marcos também são sinalizados no gráfico com o mesmo ícone do cronograma.
Por padrão, é apresentado o gráfico de todos os anos do cronograma, mas você pode escolher ver somente um ano por vez, assim como pode determinar até que nível de tarefas será apresentado no gráfico utilizanod o filtro.

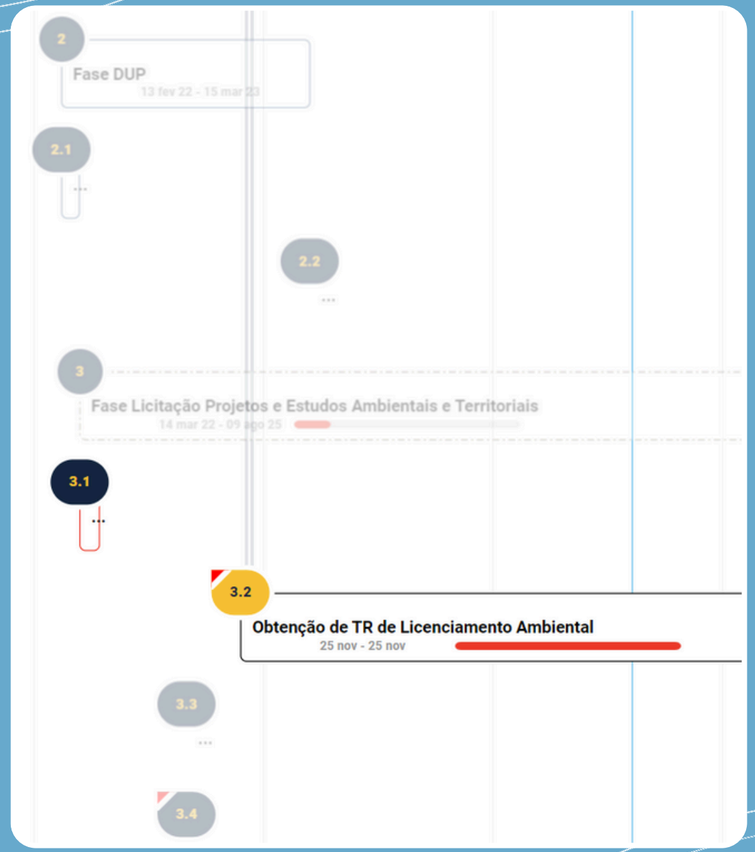

# Painel de Projetos

ACOMPANHAMENTO DO PROJETO



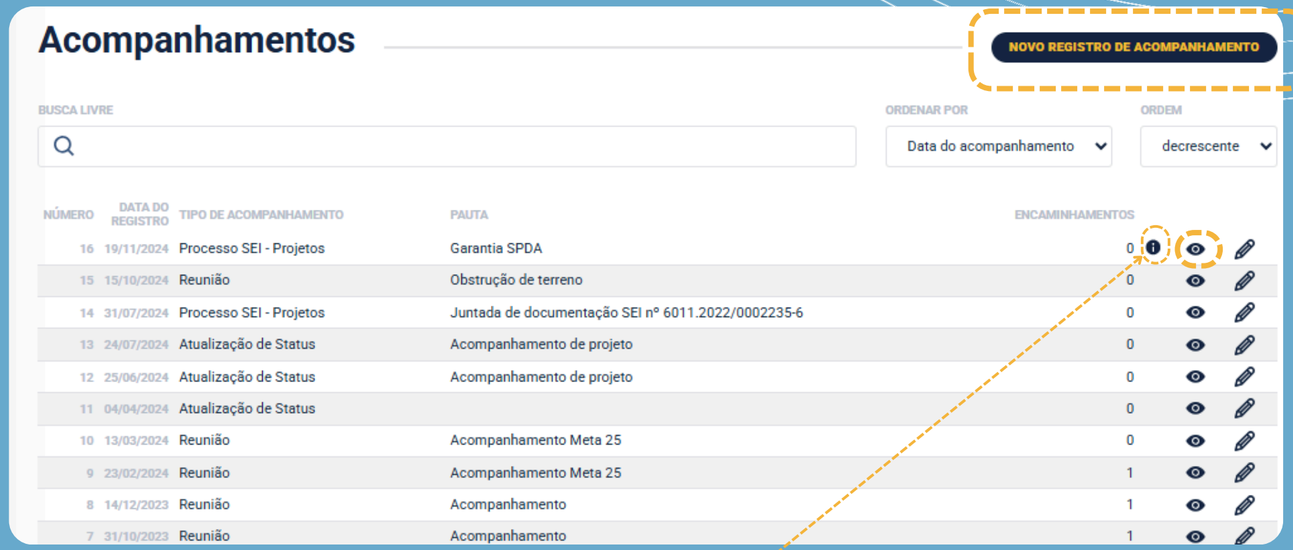
Indicação de que esse acompanhamento será apresentado no relatórios de situacao do projeto





O **SMAE** apresenta uma funcionalidade para registro dos acompanhamentos dos projetos.


Clique em “novo registro de acompanhamento” para incluir. Clique sobre o ícone do “olho” para abrir um resumo do registro.

# Painel de Projetos

ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

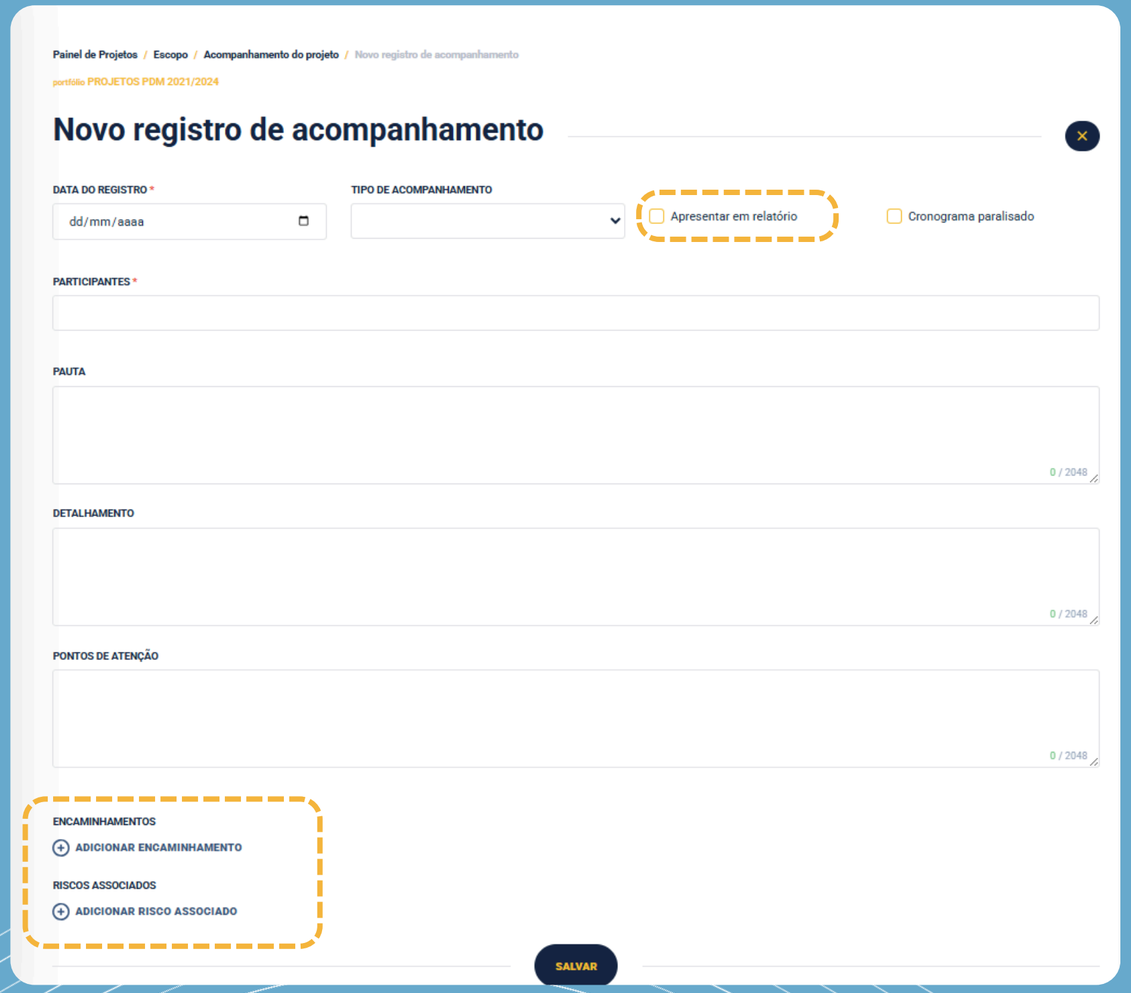


Marque o checkbox **“Apresentar em relatório”** se os dados desse acompanhamento representam a situação atual do projeto. Indique os encaminhamentos necessários e os riscos tratados, se for o caso.

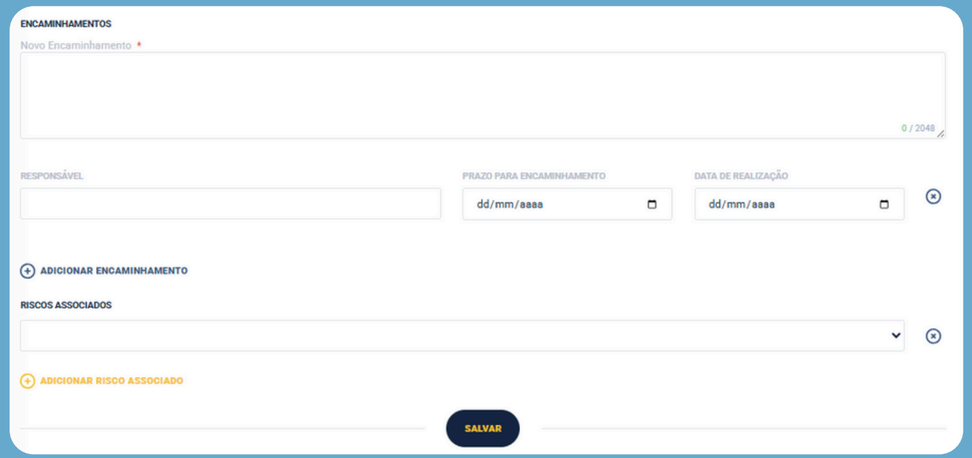

# Painel de Projetos

GESTÃO DE RISCOS

01 Etapa | 02 Etapa | 03 Etapa | 04 Etapa | 05 Etapa

Em Acompanhamento





Aqui são listados todos os riscos do projeto. Você pode filtrar os riscos por grau de risco ou status e/ou buscar por termo existente na lista.

Para criar um risco utilize o botão **“Novo risco”** e para editar um risco clique sobre o ícone do lápis correspondente.

# Painel de Projetos

GESTÃO DE RISCOS


Assim que você informar a probabilidade e o impacto, o **SMAE** calculará automaticamente o nível e o grau do risco, bem como a resposta indicada.
Note que a resposta indicada é apenas uma orientação, cabendo aos responsáveis a decisão sobre a resposta a ser tomada.
Caso o risco se refira a tarefas do cronograma do projeto, indique essas tarefas.

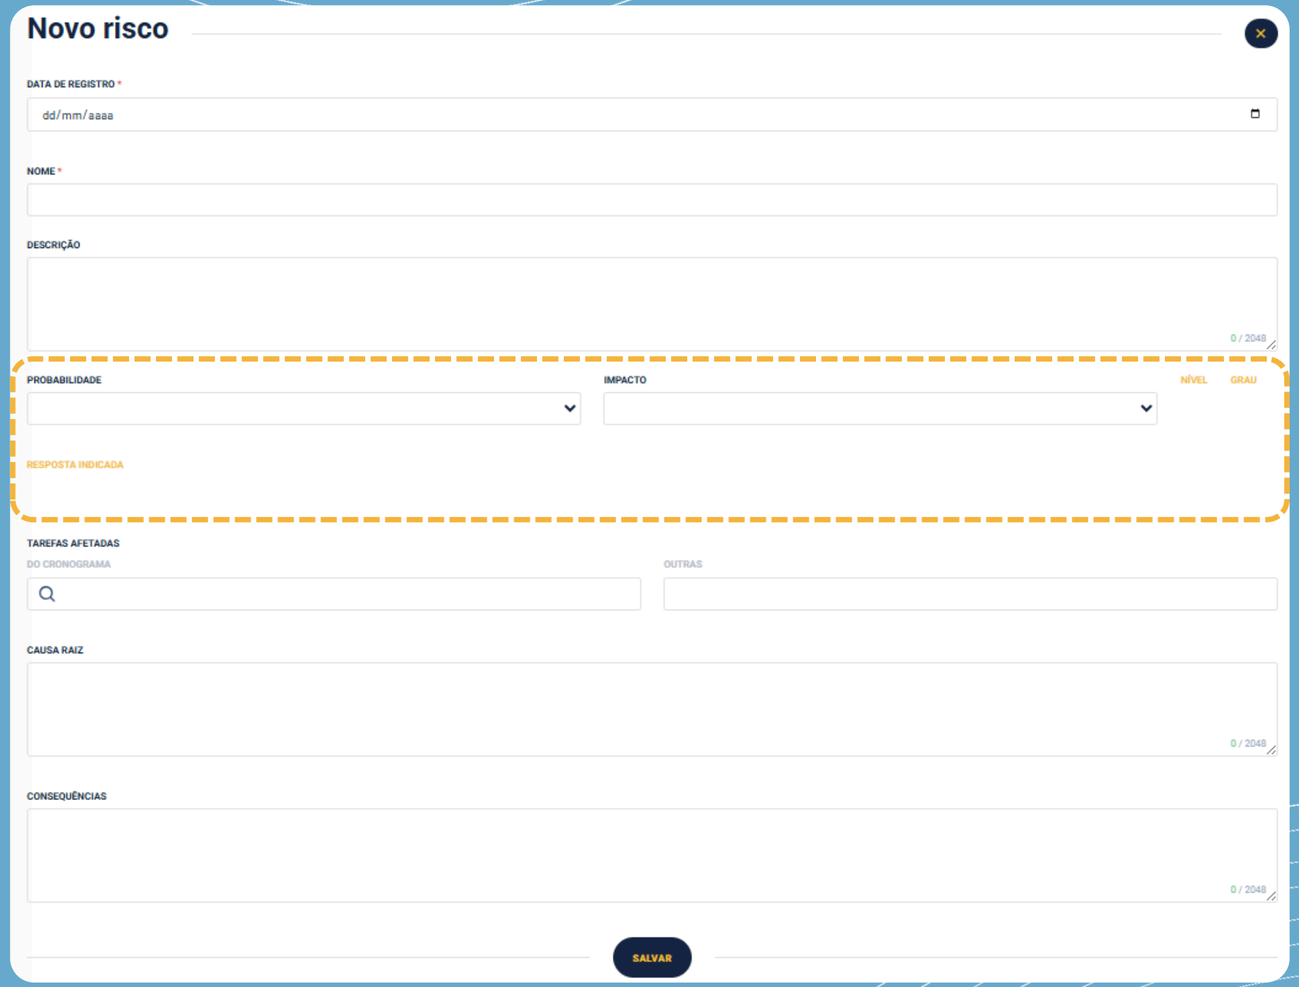

# Painel de Projetos

GESTÃO DE RISCOS

Clique no nome do risco para abrir o resumo do risco e cadastrar um **Plano de acão** para ele.

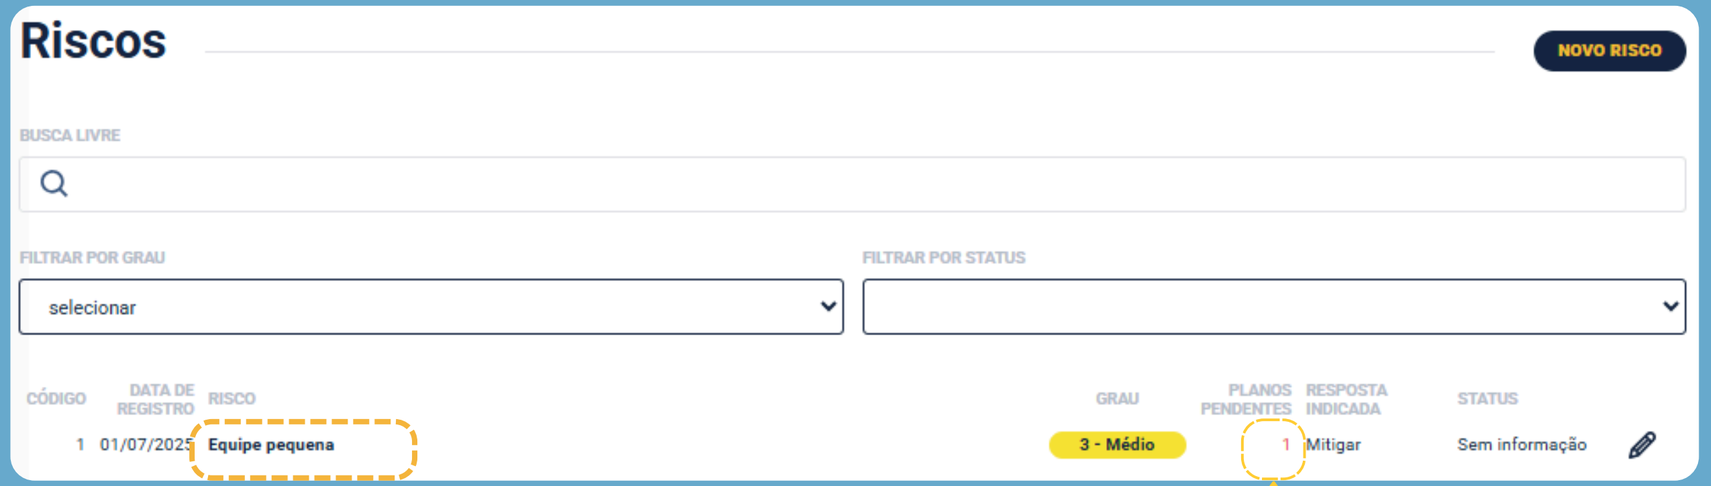



Indica a quantidade de planos de ação pendentes desse risco

# Painel de Projetos

GESTÃO DE RISCOS

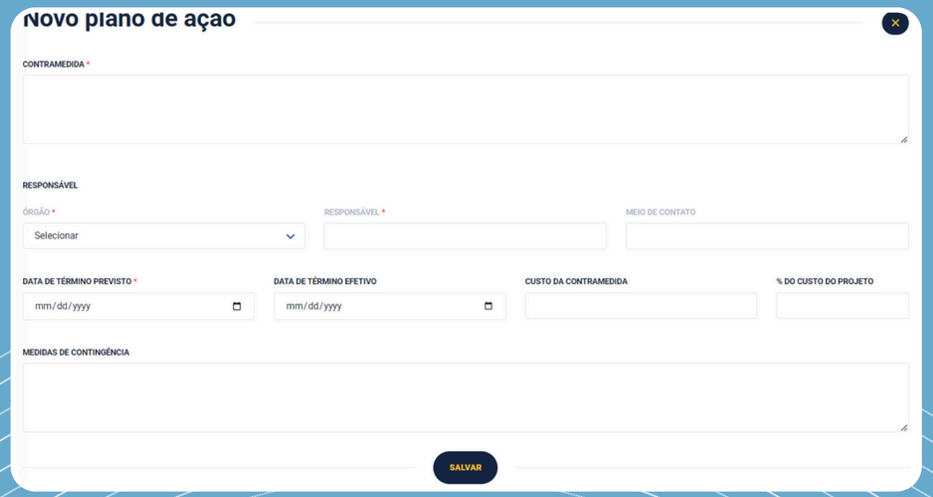


Indica plano de ação ativo

Registros de monitoramento do plano de ação

Para mudar o **“status”** do risco clique em **“mudar status”** e selecione a nova situação


Clique em **“+ adicionar plano de ação”** para incluir um novo plano de ação.


Clique no ícone da **“setinha”** para abrir/fechar os registros de monitoramento do plano de ação .

Clique no ícone **“+”** para incluir um novo registro de monitoramento para esse plano de ação

# Painel de Projetos

DOCUMENTOS DO PROJETO



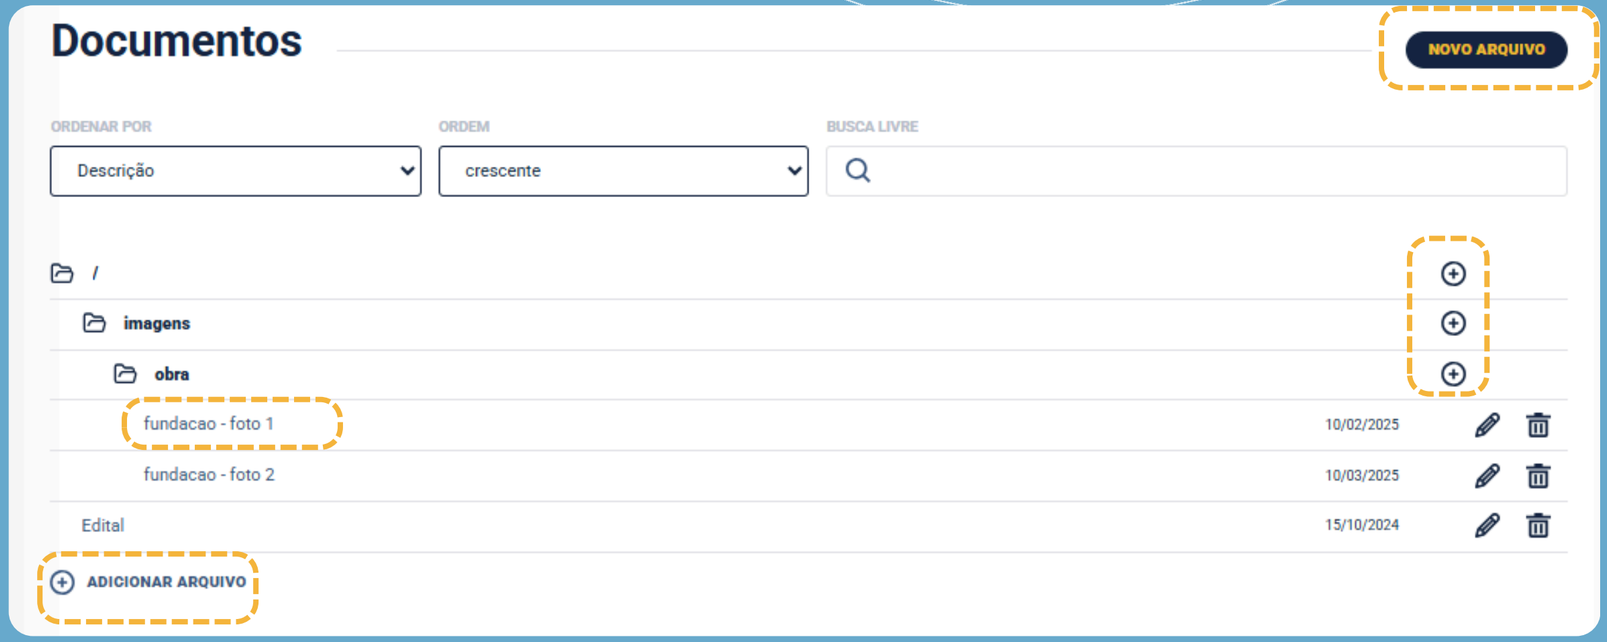
Nesta página é possível visualizar todos os documentos associados a este projeto.
Os filtros no topo permitem que documentos específicos sejam localizados.

Clique no nome de um arquivo para baixá-lo.

Para adicionar um novo documento, há três maneiras: o botão no canto superior "**Novo arquivo**", o botão embaixo da lista de documentos "**Adicionar arquivo**" e o ícone "**+**" no canto direito da tabela. Todas essas maneiras levam ao mesmo modal de adição de arquivo.

# Painel de Projetos

DOCUMENTOS DO PROJETO

Preencha os campos no modal com os dados do arquivo.

Para incluí-lo dentro de uma pasta existente, digite no campo "Pasta ou caminho": /nomedapasta.


Por exemplo:

"/"coloca o arquivo na raiz, ou seja, fora de uma pasta.
"/imagens" cria a pasta imagens se ela não existir e coloca o arquivo dentro dela.

Clique "Selecionar arquivo" para fazer o upload do arquivo do seu computador para o SMAE.


Clique em "Salvar" para completar o processo.

O **tipo de documento** categoriza os documentos e determina os tipos de arquivos que podem ser anexados. O cadastro de tipos de documentos é um cadastro básico do sistema e pode ser configurado em "Administração".

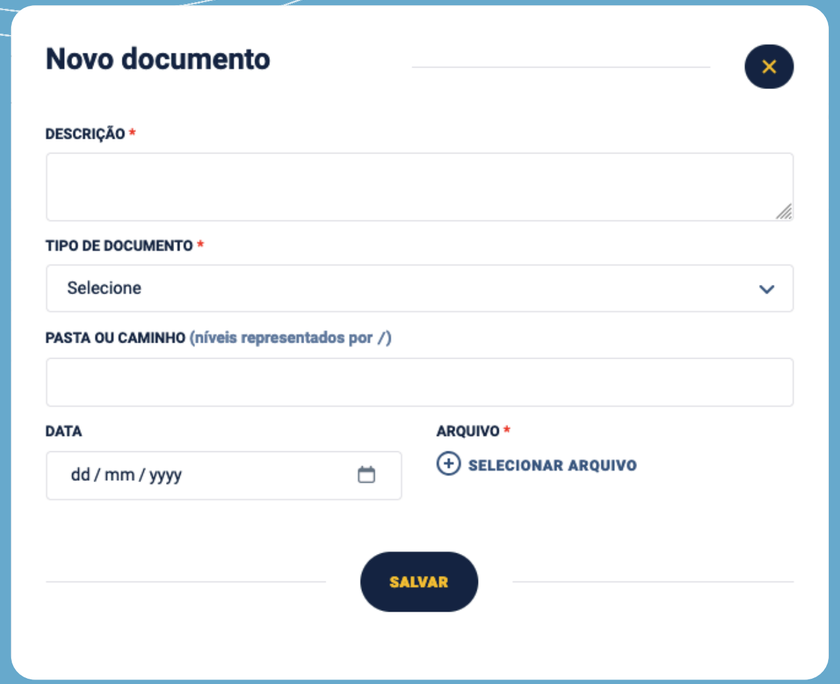

# Painel de Projetos


PROCESSOS SEI




Esta página contém todos os processos SEI registrados deste projeto. Para editar um processo existente clique no ícone de lápis na lateral direita. Para excluir um processo clique no ícone "**X**" no mesmo local.

Clicar no número do processo SEI permite a visualização do resumo do registro daquele processo no SMAE.


E por último, para adicionar um processo clique no botão "**Novo processo**".

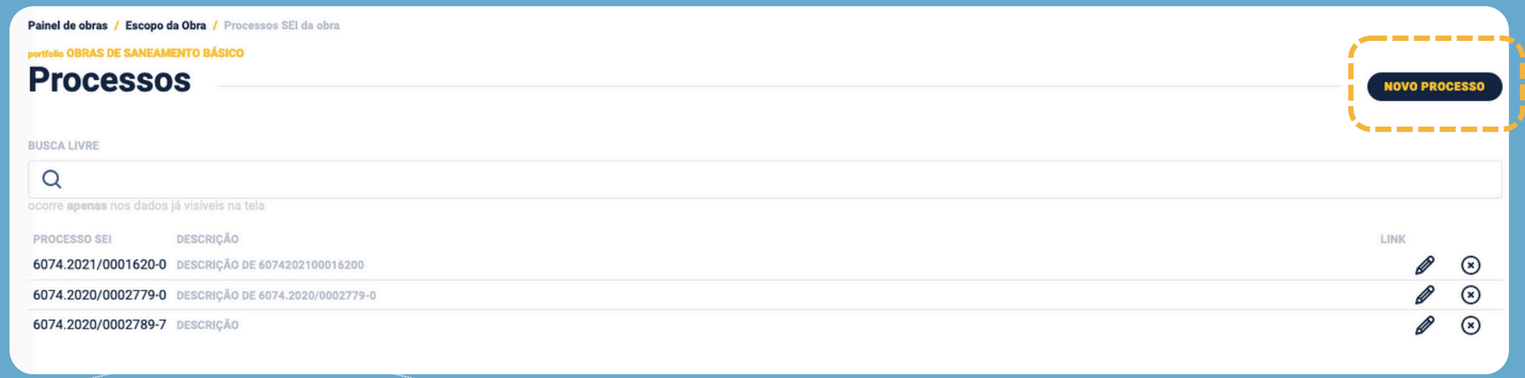

# Painel de Projetos

PROCESSOS SEI

Preencha os campos com os dados necessários para criar um novo processo.
No caso de processos antigos, voce pode informar o numero do processo SIMPROC
Clique em "**Salvar**" para terminar a tarefa.

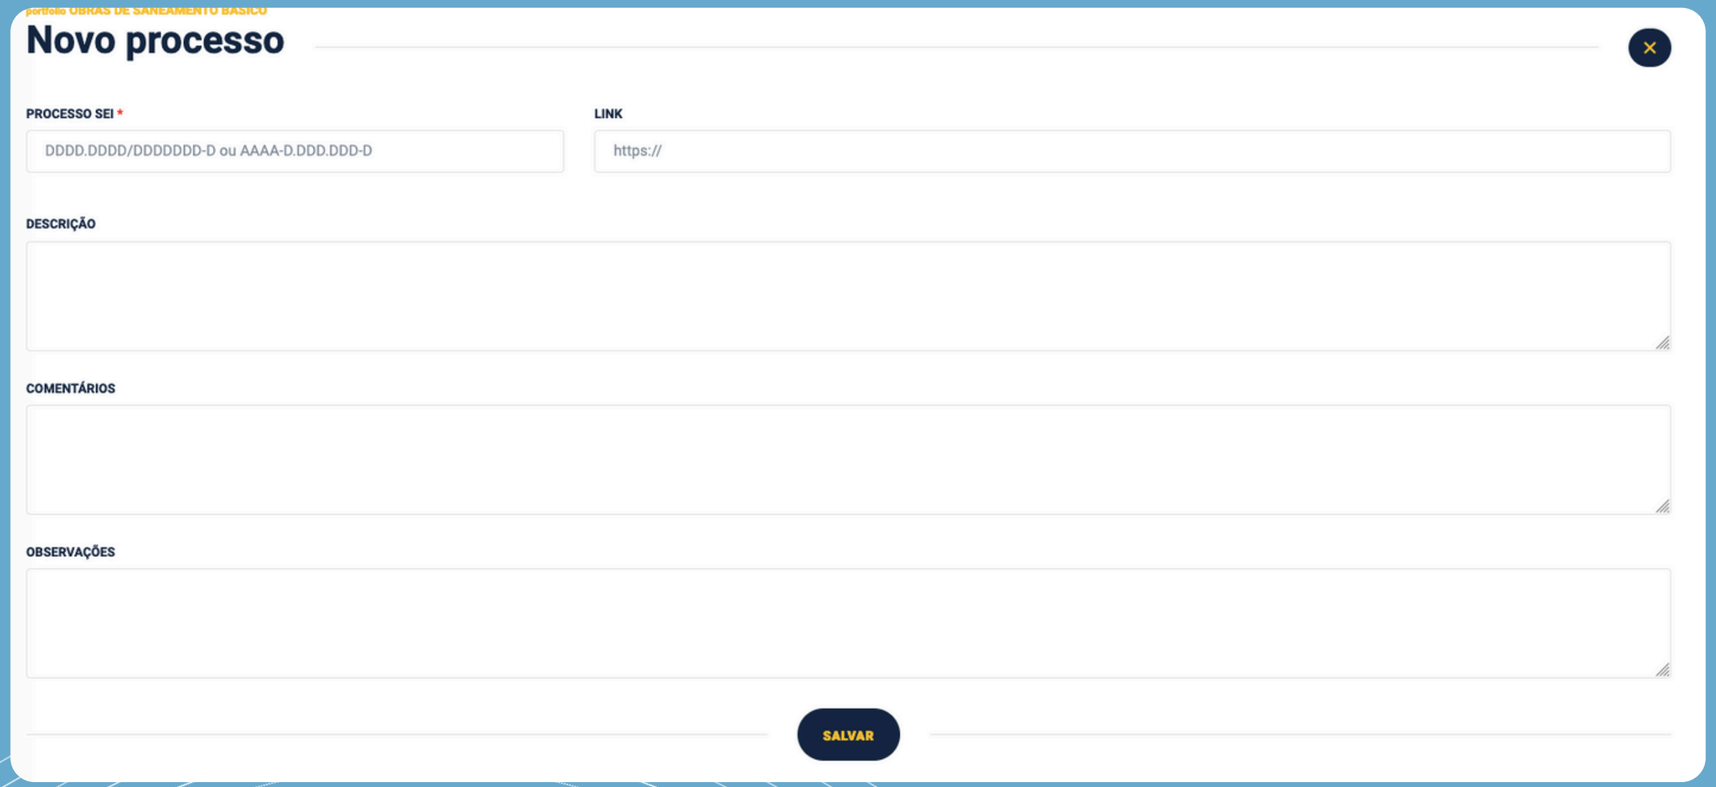

# Painel de Projetos

CONTRATOS




Esta página exibe todos os contratos relacionados a esta obra. O campo "**Busca livre**" permite procurar contratos específicos.

Clicar no número do contrato permite a visualização do resumo daquele contrato.

Para editar um contrato clique no ícone do lápis no canto direito da tabela, e para excluir um contrato, clique no ícone "**X**" no mesmo local.


Para adicionar um contrato, clique em "**Novo contrato**".



# Painel de Projetos

CONTRATOS

Preencha os campos com os dados do contrato.
Clicando no botão "**Adicionar fonte de recursos**" novos campos serão exibidos para informar as fontes de recursos caso necessário.

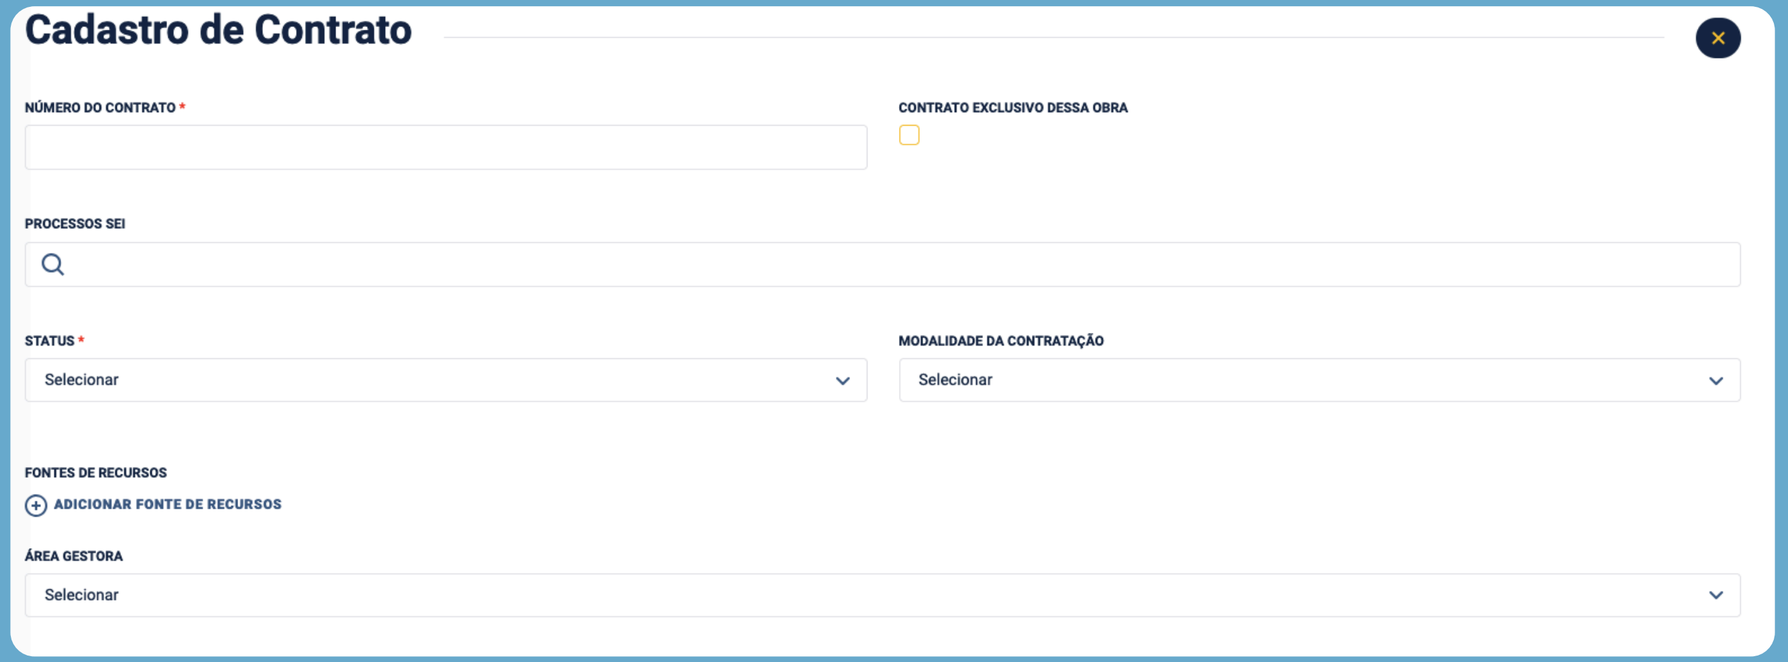


Somente os processos SEI cadastrados neste projeto estarão disponíveis para seleção neste cadastro.

# Painel de Projetos

CONTRATOS

Similar à adição de fontes de recurso no cadastro do projeto, preencha os campos abaixo para incluir os dados no contrato. Para adicionar outra fonte de recurso, clique novamente em "**Adicionar fonte de recurso**". Caso deseje excluir uma fonte de recurso, clique no "**X**" no canto direito.



# Painel de Projetos

CONTRATOS


Similar à adição de fontes de recurso no cadastro do projeto, preencha os campos abaixo para incluir os dados no contrato. Para adicionar outra fonte de recurso, clique novamente em "**Adicionar fonte de recurso**". Caso deseje excluir uma fonte de recurso, clique no "**X**" no canto direito.



# Painel de Projetos

CONTRATOS

Preencha os demais campos do contrato e clique em "**Salvar**" para que o contrato aparece na tabela inicial.

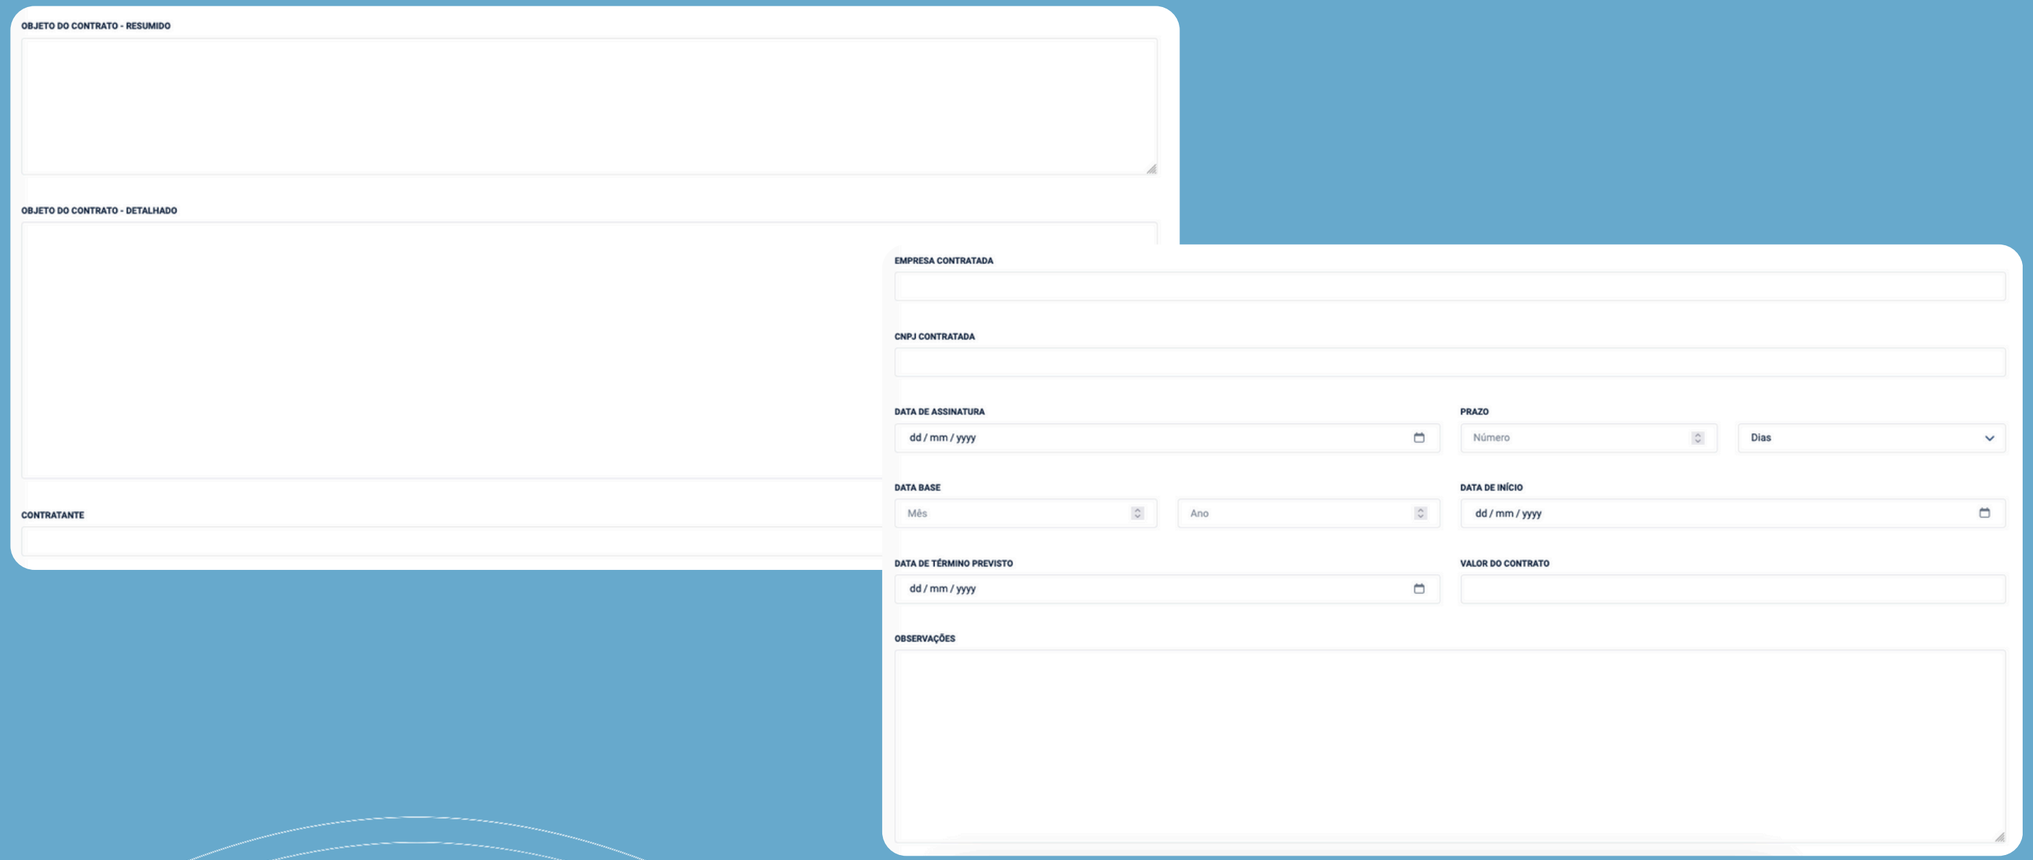

# Painel de Projetos

CONTRATOS

Para adicionar um aditivo ao seu contrato, abra o resumo de um contrato clicando em seu número na tela inicial de contratos.




Dentro do resumo do contrato, clique em "**Adicionar aditivos**".




# Painel de Projetos

CONTRATOS - ADITIVOS

Uma tela será aberta para a inclusão de aditivos.


Lembre-se que o valor informado deve ser o valor atualizado do contrato. Exemplo se o contrato era de R$1.000,00 e foi feito um aditivo de 20%, o valor informado deve ser R$1.200,00.


Clique em "**salvar**" para incluir o aditivo na tabela de contratos.

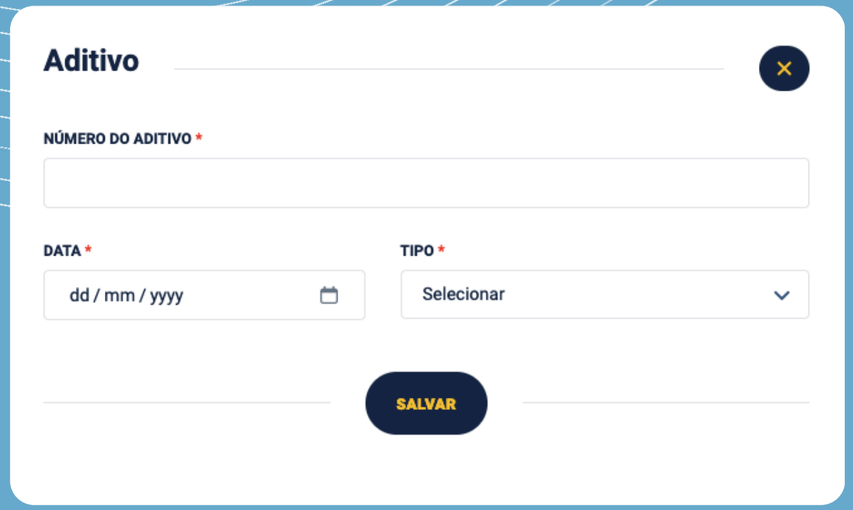



O campo "Tipo" altera os campos necessários para salvar o aditivo.

Diferentes tipos de aditivos requerem diferentes dados a serem fornecidos.

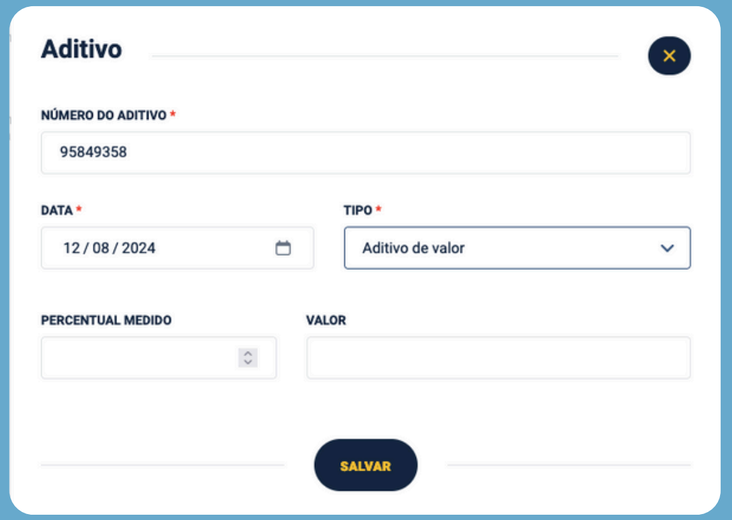

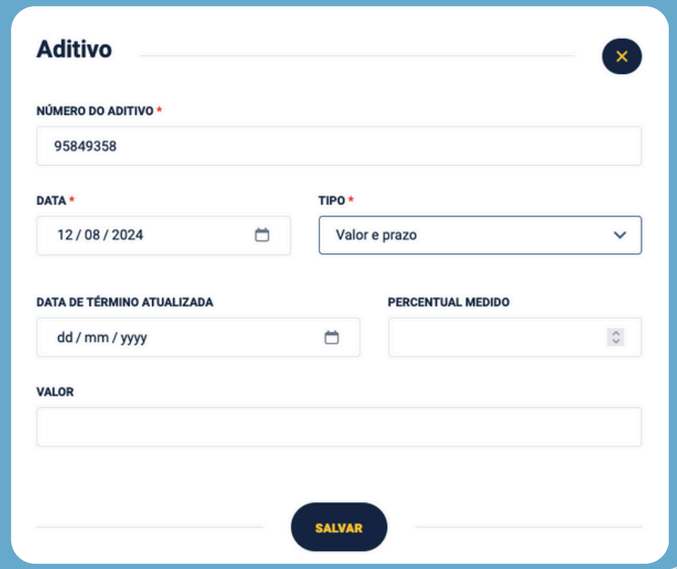


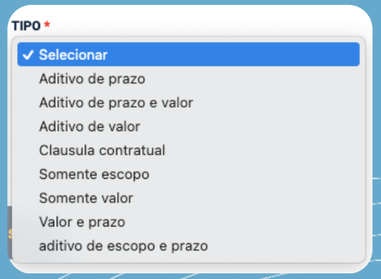
# Painel de Projetos

LIÇÕES APRENDIDAS






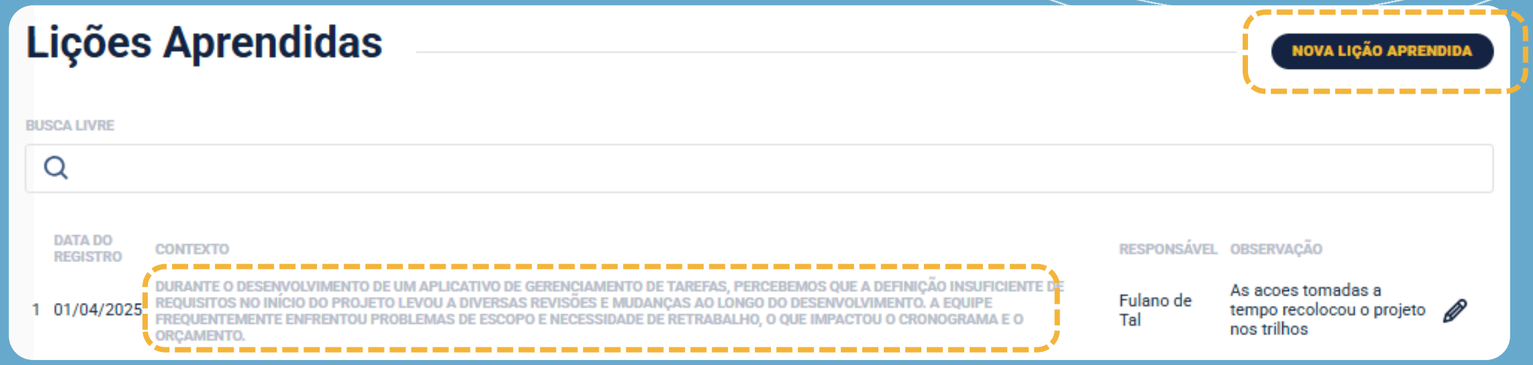




Para criar uma nova lição aprendida clique em "**Nova lição aprendida**". Caso queira editar uma lição clique no ícone de **“lápis”** ao lado da lição desejada.

Clicar sobre o **“contexto”** abre a tela de resumo da **“lição aprendida”.**

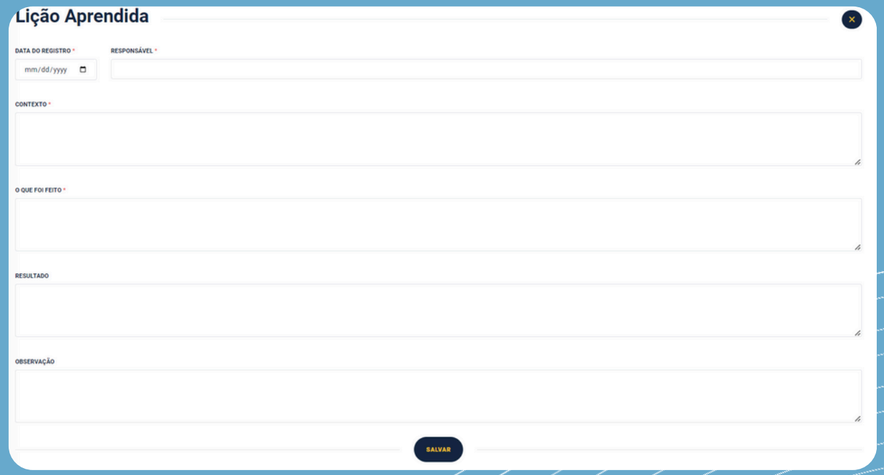

# Painel de Projetos

PREVISÃO DE CUSTOS





Esta página exibe todas as previsões de custo do projeto, separados por anos de atividade no cronograma.

Para editar uma previsão de custo existente, clique no ícone de lápis no lado direito da tabela.


Para adicionar uma previsão de custo, clique no botão "**Adicionar previsão de custo**" embaixo do ano correspondente desejado.

Os anos disponíveis são definidos pelo período registrado no cronograma da obra.

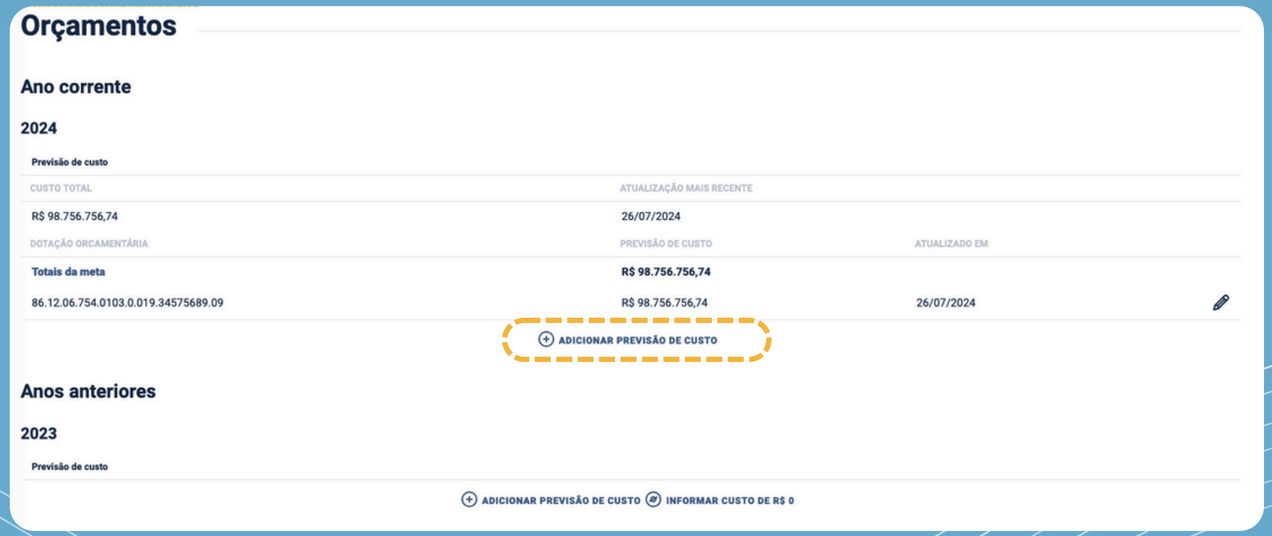

# Painel de Projetos

PREVISÃO DE CUSTOS

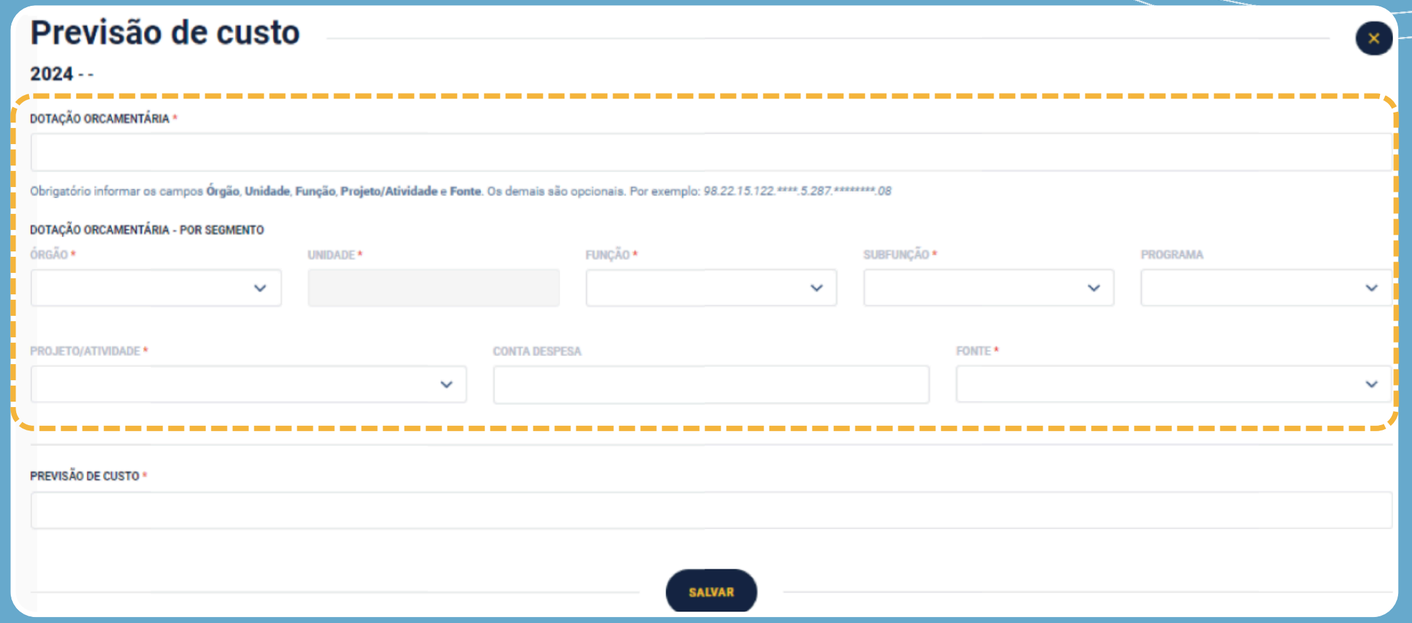


Você pode preencher o número da dotação ou usar os campos com listas para formar esse número.

Conforme você preenche um campo, o outro reflete o seu preenchimento.

Os campos Programa e Conta despesa podem ser preenchidos com asteriscos caso ainda não estejam definidos.

# Painel de Projetos


ORÇAMENTO PLANEJADO




Esta página exibe todos os orçamentos relacionados à obra, separados por anos de atividade da obra.

Para editar uma dotação existente clique no ícone de lápis no lado direito da tabela.

Para incluir uma nova dotação, clique no botão "**Adicionar dotação**" embaixo do ano correspondente desejado.

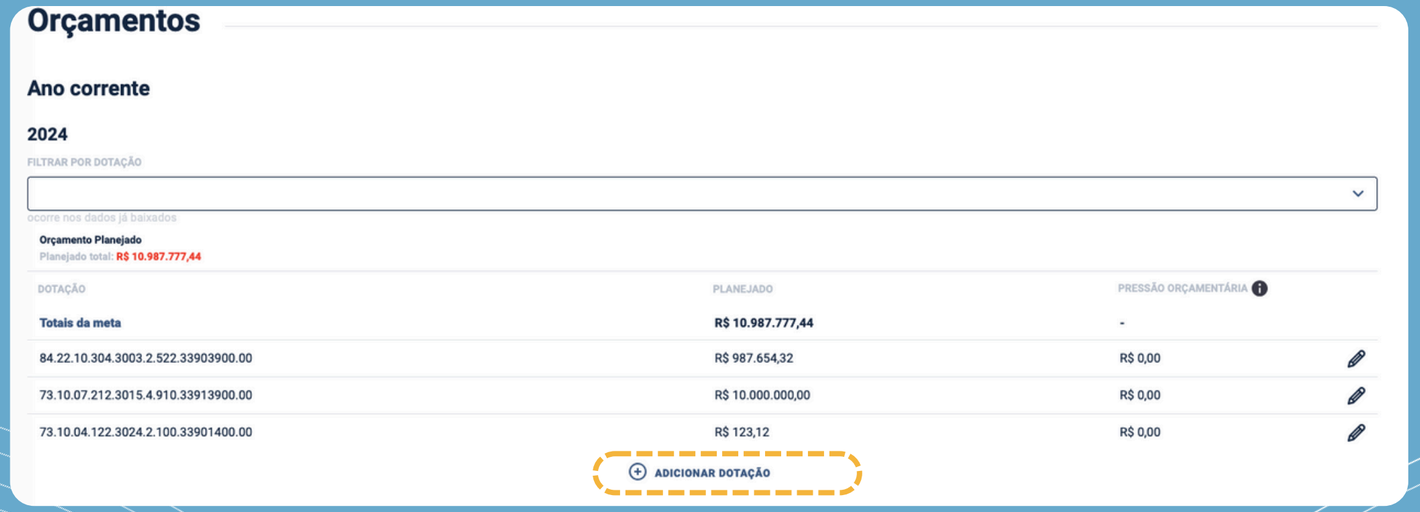

# Painel de Projetos


ORÇAMENTO PLANEJADO

01 Etapa | 02 Etapa | 03 Etapa | 04 Etapa | 05 Etapa

Em Acompanhamento

A dotação orçamentária pode ser informada de duas maneiras diferentes: digitando os números diretamente no campo "**dotação orçamentária**", ou selecionando os números correspondentes nos campos *dropdown* dentro da sessão "**dotação orçamentária - por segmento**".

Clique primeiro em "**Validar via SOF**", e uma vez validada a dotação, em "**Salvar**" para adicioná-la.

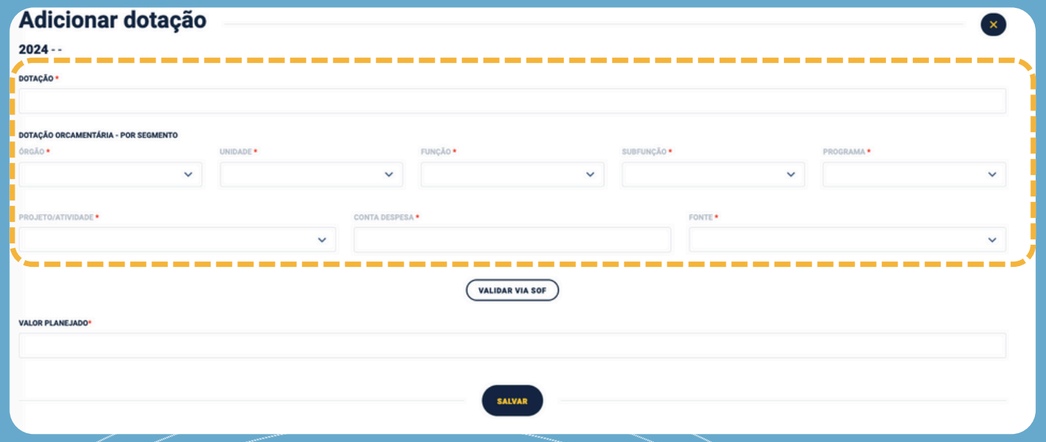


O sistema busca o valor da dotação na LOA via SOF. É permitido que o valor da dotação seja ultrapassado, no entanto o sistema sinaliza a pressão orçamentária.

Essa validação é transversal a todos os projetos dentro de um mesmo portfólio, visto que uma dotação pode ser associada a vários projetos.

Ao clicar em "**Validar via SOF**" o SMAE busca no SOF as informações sobre o orçamento inicial, o orçamento atualizado e o saldo disponível dessa dotação.

# Painel de Projetos

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA




Esta página exibe todas as execuções orçamentárias relacionadas ao projeto, separados por anos.

Para editar uma execução orçamentária existente clique no ícone de lápis no lado direito da tabela.

Para adicionar uma execução orçamentária, clique no botão "**Informar execução orçamentária**" ao lado do ano correspondente desejado. As seguintes opções serão exibidas no *dropdown*: "**Dotação**", "**Processo**" e "**Nota de empenho**"



# Painel de Projetos

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Selecionando "**Dotação**", a seguinte tela será exibida.

A dotação orçamentária pode ser informada de duas maneiras diferentes: digitando os números diretamente no campo "**dotação orçamentária**", ou selecionando os números correspondentes nos campos *dropdown* dentro da sessão "**dotação orçamentária - por segmento**".

Clique primeiro em "Validar via SOF", e uma vez validada a dotação, campos para o preenchimento de valores serão apresentados.

Ao clicar em "**Validar via SOF**" o SMAE busca no SOF as informações sobre o empenho e a liquidação dessa dotação



# Painel de Projetos


EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Caso opte por informar o processo.

Digite o processo SEI ou SINPROC no formato indicado dentro do campo.

Clique primeiro em "Validar via SOF".

Uma vez que foi validado via SOF o sistema apresenta uma tela com uma lista de dotações e respectivos valores de empenho e liquidação para o usuário escolher uma dessas dotações e campos para preenchimento dos valores do mês serão abertos.



# Painel de Projetos


EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Selecionando "**Nota de empenho**", a seguinte tela será exibida.

Preencha os campos necessários.

Clique primeiro em "**Validar via SOF**".

Uma vez que foi validado via SOF o sistema apresenta a dotação referente a essa nota e seus valores de empenho e liquidação. Os campos para preenchimento dos valores do mês serão abertos. .



# Painel de Projetos


EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Depois de validado no SOF a informação de empenho/liquidação os campos para preenchimento dos valores são os mesmos e funcionam da mesma forma.

O sistema sinaliza o empenho e/ou liquidação que ultrapassem os respectivos valores registrados no SOF. Essa validação é transversal a todas as obras de um mesmo portfólio, visto que uma dotação / processo / nota de empenho pode ser associada a várias obras.

Clique em "**+informar execução orçamentária**" , escolha o mês e informe os valores de empenho e liquidação.  O valor informado deve ser o valor acumulado no ano até o mês em questão.

Os meses disponíveis para registro da execução orçamentária são definidos no cadastro do portfólio.



# PAINEL ESTRATÉGICO

**Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Estratégico**


SMAE

SMAE.PREFEITURA.SP.FGV.BR

# Página inicial

PAINEL ESTRATÉGICO

O **“Painel estratégico”** apresenta um panorama geral dos **projetos aos quais você tem acesso**. Utilize o filtro para restringir os projetos apresentados. O painel apresenta diversos quadros:








- Quantidade de projetos
- Quantidades de órgãos responsáveis por desses projetos
- Quantidade de metas que deram origem a esses projetos

- Projetos com previsão de término no ano corrente
- Projetos concluídos no ano corrente


- Total custo previsto dos projetos (origem: cronogramas)
- Total dos empenhos (origem: execução orçamentária)
- Total das liquidações (origem: na execução orçamentária)

# Página inicial

PAINEL ESTRATÉGICO




Utilize as setas ao lado dos quadros para navegar entre eles:

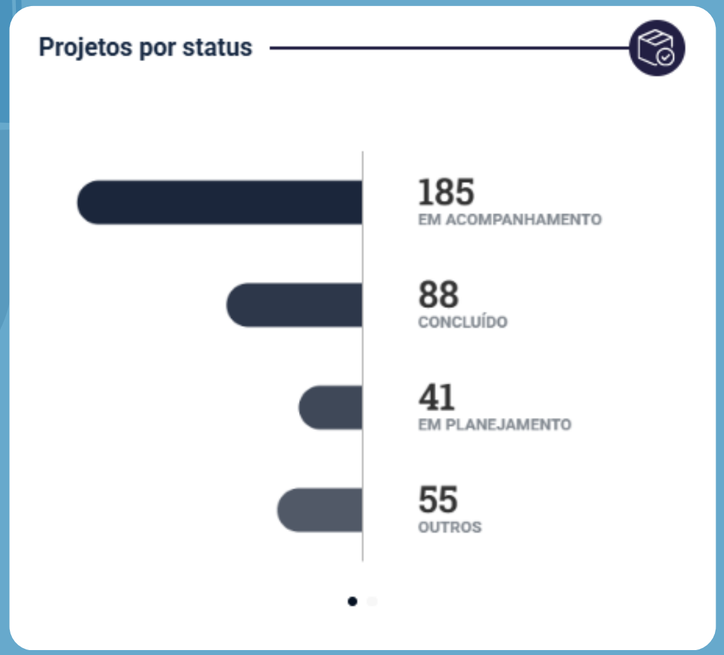


- Quantidade de projetos por **“status do projeto”**





- Quantidade de projetos por **“etapa do projeto”**


Passe o mouse sobre as barras para ver detalhes.

# Página inicial


PAINEL ESTRATÉGICO





Utilize as setas ao lado dos quadros para navegar entre eles. As barra de densidade de cor funcionam como filtro do respectivo gráfico.

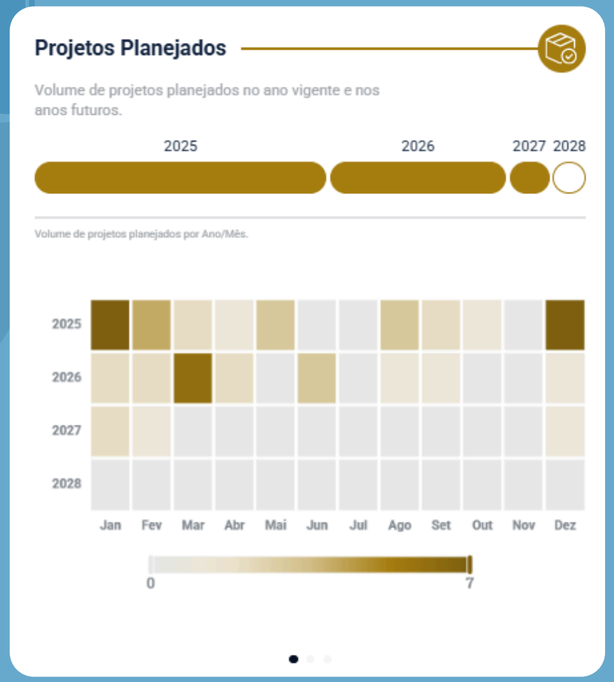


- Quantidade de projetos com previsão de término no ano vigente e próximos 3 anos

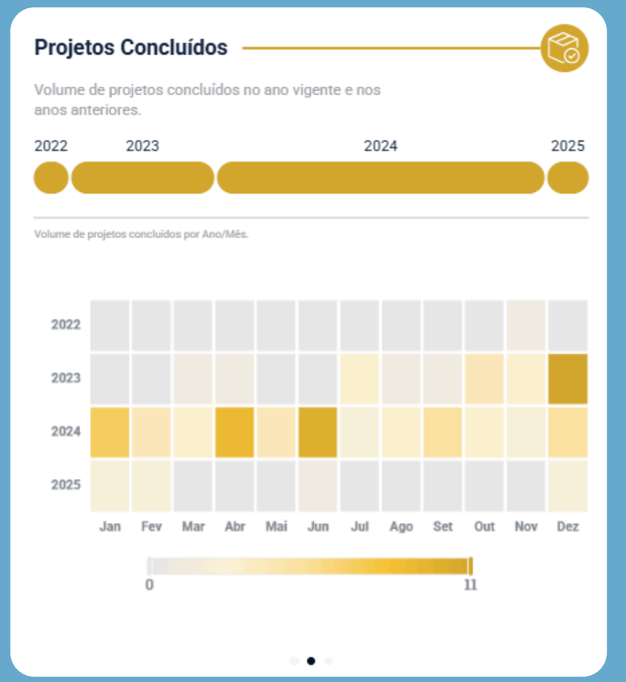


- Quantidade de projetos concluídos no ano vigente e nos últimos 3 anos

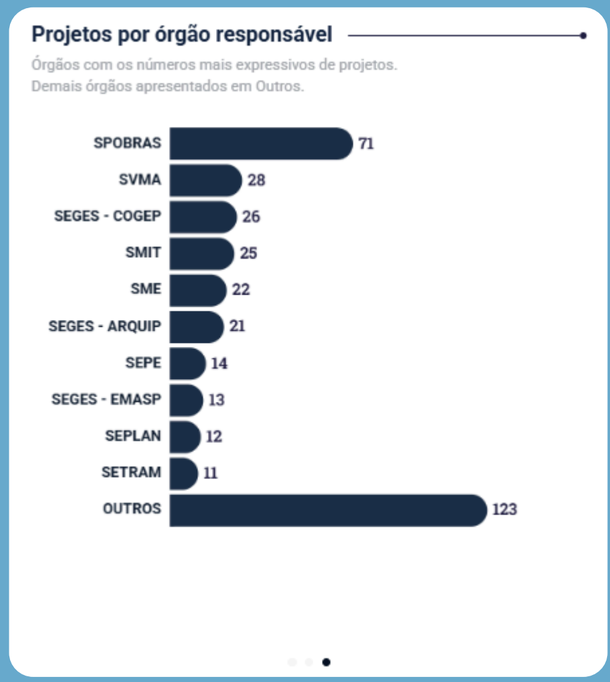



- Quantidade de projetos por órgão responsável

Passe o mouse sobre os gráficos para ver detalhes.


# Página inicial

PAINEL ESTRATÉGICO





Mapa indica os projetos com endereços informados no SMAE:

- as cores no mapa representam uma escala da quantidade de projetos  em cada subprefeitura.
- os “pino” apontam esses endereços no mapa
- clique sobre o “pino” abre os detalhes do projeto.
- os botões **“+”** e **“-”** permitem dar **“zoom”** no mapa

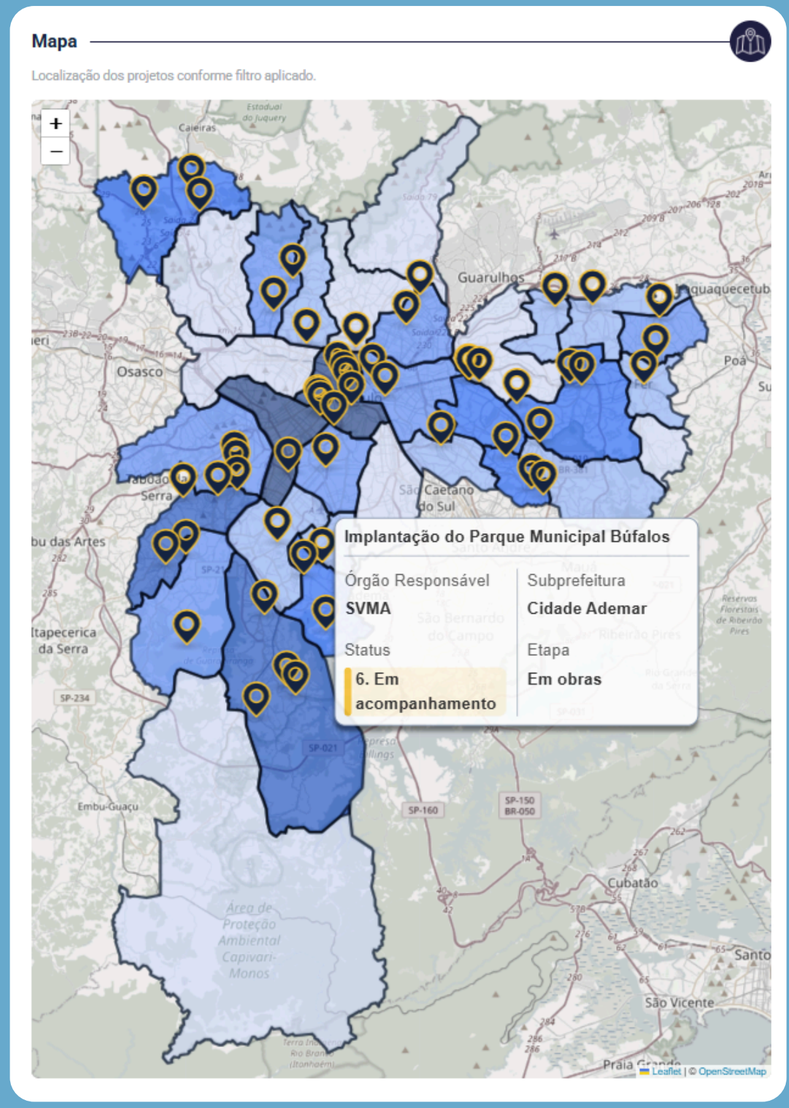

# Página inicial

PAINEL ESTRATÉGICO





A lista de projetos que atendem ao filtro pode ser grande e portanto é exibida em páginas.  Utilize barra de navegação para mudar de página.

Clique sobre o nome do projeto para abrir sua tela de resumo.



# Página inicial


PAINEL ESTRATÉGICO




O quadro de execução orçamentária apresenta o gráfico comparando os custos planejados e a execução orçamentária (empenho e liquidação).
Você pode ligar/desligar individualmente cada gráfico clicando sobre a respectiva legenda.

A lista de projetos trás um gráfico em cada linha com a representação em percentual de seu custo total, custo previsto até o momento (ambos com origem no cronograma do projeto) e dados da execução orçamentária.

A lista de projetos pode ser grande e nesse caso é exibida em páginas. Utilize barra de navegação para mudar de página.

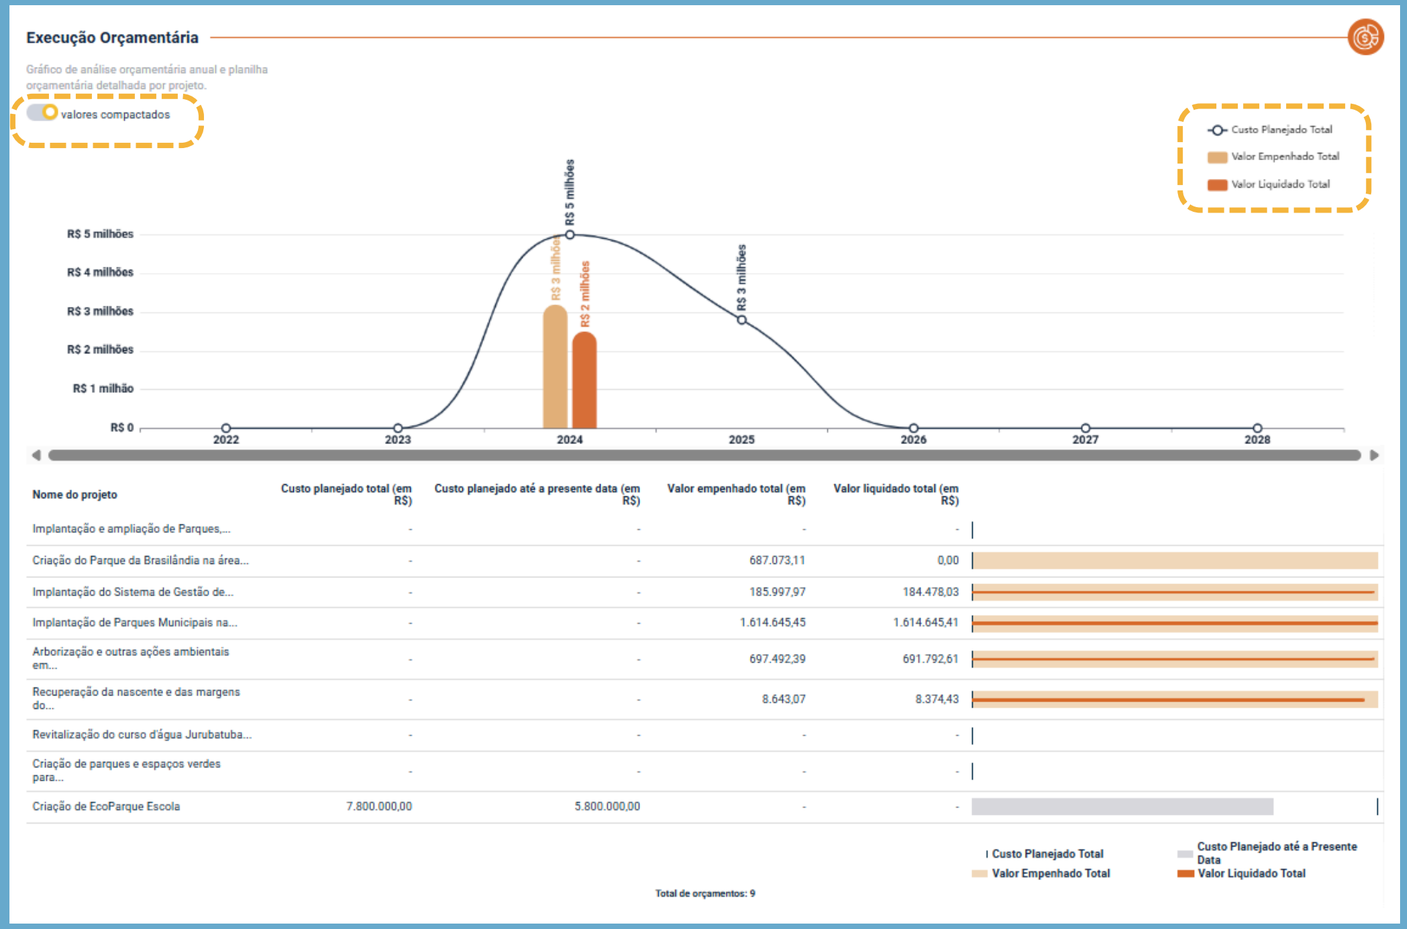

# ANÁLISE


**Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Estratégico**

SMAE

SMAE.PREFEITURA.SP.FGV.BR

# Análise

ANÁLISE E SUA IMPORTÂNCIA





Por padrão a funcionalidade de “Análise” apresenta a página de “Painéis externos” com o primeiro painel selecionado e portanto exibido.

Escolha outro painel na lista para trocar a exibição. Só estarão listados os painéis do módulo de projetos aos quais você tem permissão de acesso.


Se você não tem acesso a nenhum painel externo, a página do dashboard de “**gestão de projetos**” será apresentada.

Para mudar para a página do dashboard de “**gestão de projetos**” clique no botão correspondente no topo dessa página

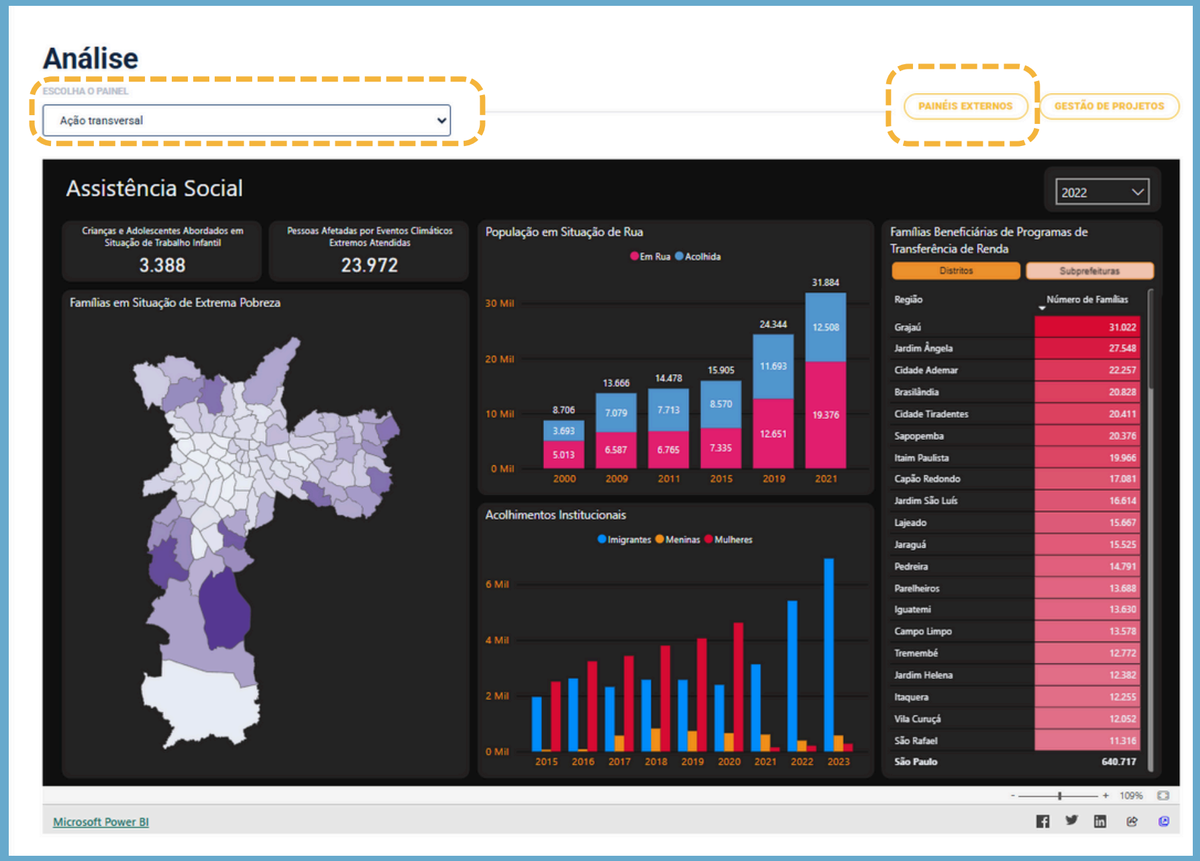

# Análise

ANÁLISE DE PROJETO




O Dashboard apresenta um panorama dos Portfólios de Projetos aos quais você tem acesso.

Utilize os filtros para restringir os projetos considerados nos gráficos e tabelas.
Os filtros se aplicam a todos os quadros do dashboard.

Você pode também clicar sobre os gráficos para filtrar os dados.
Exemplo se você clicar no gráfico de status do projeto sobre a cor laranja, o filtro será preenchido com o status “em planejamento” e todos os quadros serão recalculados. Para cancelar a filtragem é só clicar no mesmo lugar novamente.

Posicionar o mouse sobre os gráficos apresenta detalhes sobre os dados.



# RELATÓRIOS


**Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Estratégico**


SMAE

SMAE.PREFEITURA.SP.FGV.BR

# Relatórios

RELATÓRIOS DE PROJETOS



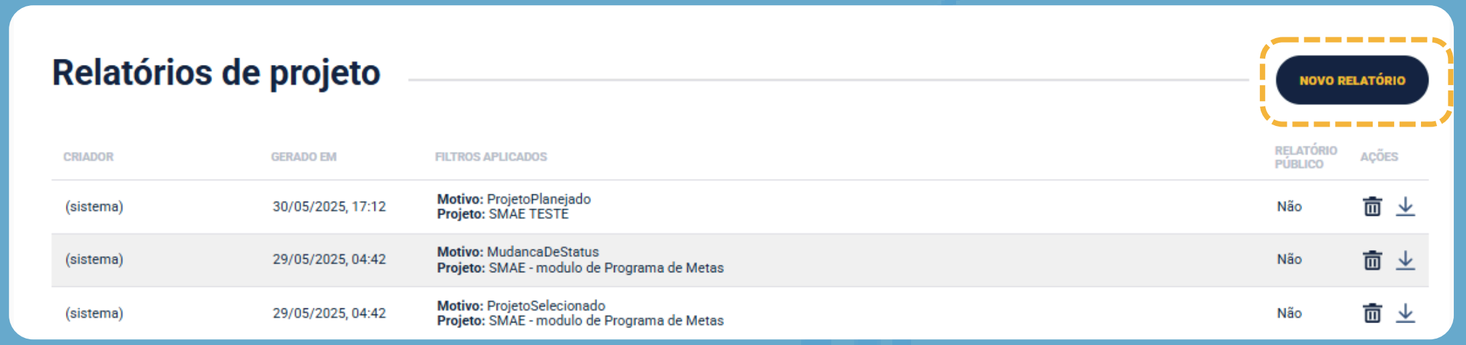
Aqui você pode tirar uma "fotografia instantânea" do projeto. Use esse recurso sempre que quiser guardar os dados de certo momento antes que sejam atualizados pelo andamento do projeto.
O sistema gera um relatório automático quando o projeto passa da fase de registro para selecionado.


Clique em **“novo relatório”** para abrir a tela de filtro.
Use o ícone da **“setinha para baixo”** para baixar uma cópia do arquivo para sua máquina.
O arquivo .zip conterá planilhas com nomes auto explicativos nos formatos .csv e .xlsx , um arquivo .json com os parâmetros de busca do relatório e um arquivo .svg que conterá o desenho da EAP em 2 níveis.





Relatório público significa que os dados gerados ficam disponíveis para todos que tem acesso a essa funcionalidade e ao plano setorial em questão.
Caso contrário somente quem emitiu o relatório tem acesso a ele.

# Relatórios


RELATÓRIOS DE PORTFÓLIOS




Aqui você extrai dados completos dos projetos de um portfólio.


Clique em **“novo relatório”** para abrir a tela de filtro.
Use o ícone da **“setinha para baixo”** para baixar uma cópia do arquivo para sua máquina.
O arquivo .zip conterá planilhas com nomes auto explicativos nos formatos .csv e .xlsx , um arquivo .json com os parâmetros de busca do relatório.

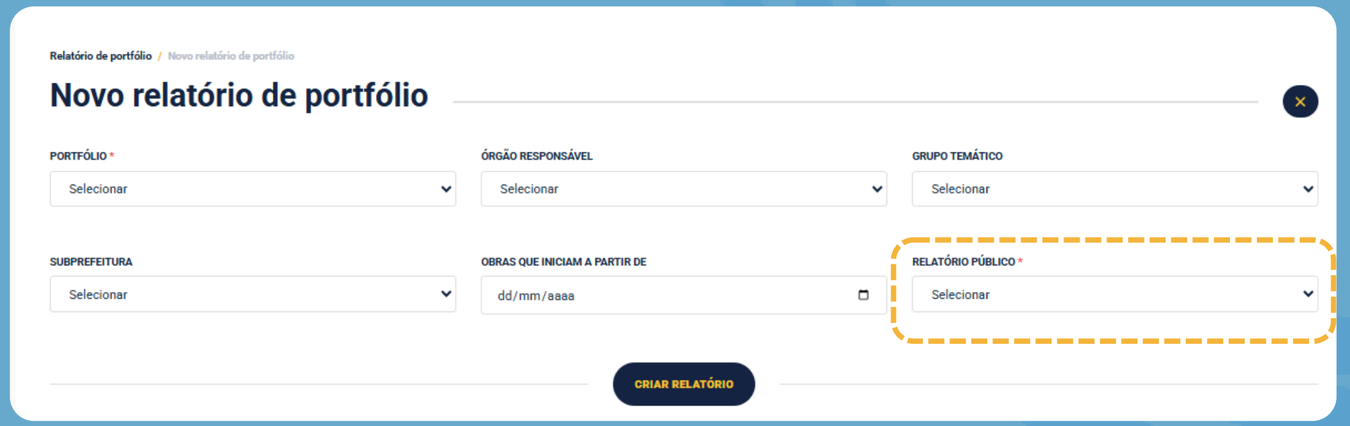



Relatório público significa que os dados gerados ficam disponíveis para todos que tem acesso a essa funcionalidade e ao plano setorial em questão.
Caso contrário somente quem emitiu o relatório tem acesso a ele.

# Relatórios


RELATÓRIOS DE STATUS




Aqui você extrai dados dos acompanhamentos de projetos, referentes aos acompanhamentos dos projetos de um portfólio.


Clique em **“novo relatório”** para abrir a tela de filtro.
Use o ícone da **“setinha para baixo”** para baixar uma cópia do arquivo para sua máquina.
O arquivo .zip conterá planilhas com nomes auto explicativos nos formatos .csv e .xlsx , um arquivo .json com os parâmetros de busca do relatório. O ícone de “exclamação” indica que o arquivo não está pronto.




Relatório público significa que os dados gerados ficam disponíveis para todos que tem acesso a essa funcionalidade e ao plano setorial em questão.
Caso contrário somente quem emitiu o relatório tem acesso a ele.

# Relatórios

RELATÓRIOS DE PREVISÃO DE CUSTO







Aqui você pode extrair dados referentes as previsões de custo dos projetos de um portfólio.


Clique em **“novo relatório”** para abrir a tela de filtro.
Use o ícone da **“setinha para baixo”** para baixar uma cópia do arquivo para sua máquina.
O arquivo .zip conterá planilhas com nomes auto explicativos nos formatos .csv e .xlsx , um arquivo .json com os parâmetros de busca do relatório.




Relatório público significa que os dados gerados ficam disponíveis para todos que tem acesso a essa funcionalidade e ao plano setorial em questão.
Caso contrário somente quem emitiu o relatório tem acesso a ele.

# Relatórios

RELATÓRIOS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA







Aqui você pode extrair dados do planejamento e execução orçamentária dos projetos de um portfólio. O relatório analítico traz todos os apontamentos e o consolidado traz somente o último.

Clique em **“novo relatório”** para abrir a tela de filtro.
Use o ícone da **“setinha para baixo”** para baixar uma cópia do arquivo para sua máquina.
O arquivo .zip conterá planilhas com nomes auto explicativos nos formatos .csv e .xlsx , um arquivo .json com os parâmetros de busca do relatório.




Relatório público significa que os dados gerados ficam disponíveis para todos que tem acesso a essa funcionalidade e ao plano setorial em questão.
Caso contrário somente quem emitiu o relatório tem acesso a ele.

# ENVIO DE ARQUIVO


**Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Estratégico**


SMAE

SMAE.PREFEITURA.SP.FGV.BR

# Envio de Arquivos

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - PROJETOS



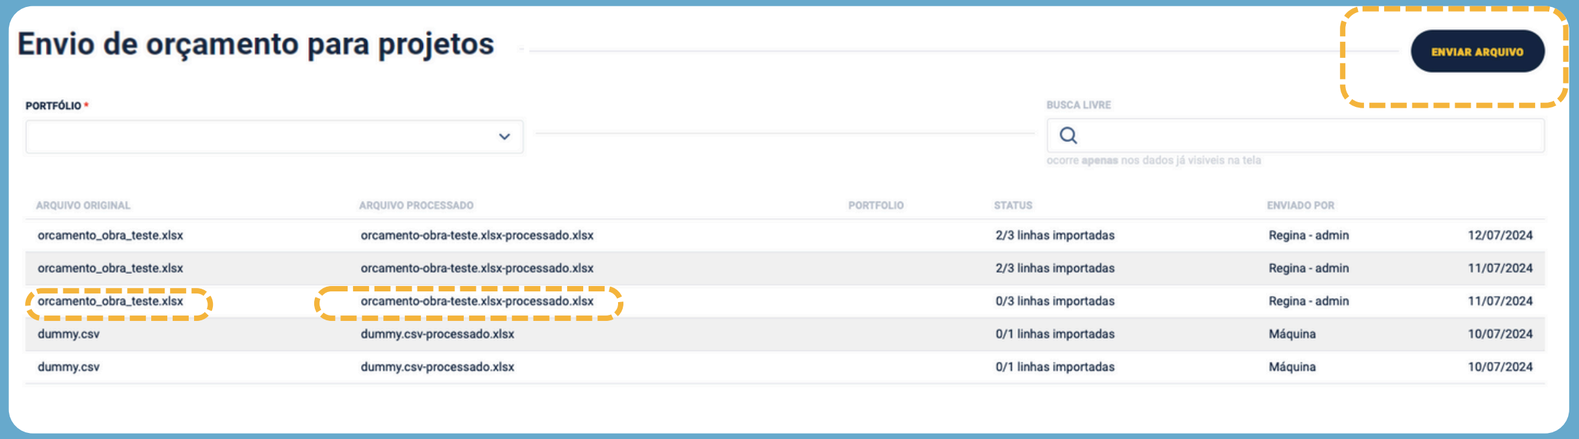
Verifique no arquivo processado o resultado da importação para cada linha da planilha.

Nessa tela estão exibidas os arquivos com dados de execução orçamentária carregados no sistema enviados deste módulo.


Através do *dropdown* "Portfólio" e do campo de busca livre é possível filtrar os arquivos visualizados.

Para enviar um arquivo clique em "**Novo arquivo**" no canto superior direito.

Para baixar o arquivo enviado e o arquivo processado basta clicar sobre o respectivo nome.

# Envio de Arquivos

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - PROJETOS




Ao clicar em "**Novo arquivo**" a seguinte modal será exibida. É possível fazer upload apenas de orçamento para obras em formato "*.xlsx*".

Selecione o portfólio correspondente ao arquivo através do *dropdown*, e selecione o arquivo do seu computador clicando em "**Selecionar arquivo**". Clique em "**salvar**" para completar o processo.





## Exemplo de arquivo

| ano | mês | valor_empenho | valor_liquidado | dotação | processo | nota_empenho | projeto_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 06 | 1000,00 | 800,00 | 16.24.12.306.3016.2.873.33903900.00 | | | 1 |
| 2023 | 06 | 2000,00 | 0,00 | | 6024202300008330 | | 1 |
| 2023 | 06 | 3400000,00 | 50000,00 | | | 13074/2023 | 5 |

# Envio de Arquivos

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - PROJETOS




O **projeto_id** pode ser encontrado na URL do resumo do projeto.

- A ordem das colunas pode variar
- Se sua planilha tiver colunas a mais elas serão ignoradas.
- O importador lê somente a primeira aba da planilha.
- Valor_empenho e valor_liquidado devem ser campos numéricos com 2 casas decimais.
- Dotação, processo e nota de empenho devem ser texto e são mutuamente exclusivos
- Na sua planilha só deve existir um valor por dotação/processo/nota_empenho para um mesmo projeto.
- O mês/ano deve estar habilitado a receber dados orçamentários.
- Você dever ter permissão para informar dados orçamentários no projeto.

# CONFIGURAÇÕES


**Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Estratégico**

SMAE

SMAE.PREFEITURA.SP.FGV.BR

# Configurações

CADASTRO DE OBSERVADORES







A funcionalidade de **Portfólios** está descrita em **Primeiros passos** no inicio desse manual

Grupos de observadores são conjuntos de pessoas que poderão ter acesso de leitura a portfólios ou projetos específicos. Aqui estão listados os grupos existentes e os respectivos projetos e/ou portfólios aos quais eles tem acesso. Para criar um novo clique em **"Novo grupo de observadores"**



# Configurações

## CADASTRO DE OBSERVADORES


Informe o órgão responsável pela criação desse grupo.
Indique os órgãos e as pessoas que farão parte desse grupo.
Clique em "**Salvar**" para que o novo grupo seja criado.




Esse grupos podem ser associados a **projetos** específicos ou a um **portfólio** como um todo. Isso pode ser feito nos respectivos cadastros no campo **“grupo de observadores”**

# Configurações

PAINÉIS EXTERNOS




Nas configurações é possível ver a opção painéis externos.

Esta página exibirá todos os painéis externos registrados e permitirá que alterações e exclusões sejam feitas. Uma vez acessada, você poderá criar painéis externos clicando no botão no canto superior direito.




# Configurações

PAINÉIS EXTERNOS

**09** Insira as informações obrigatórias, depois clique em **“Salvar”** para adicionar o novo painel com sucesso.
Selecione em “grupo de painéis externos” os grupos de pessoas que terão acesso a esse painel.


**Atenção!**

O site de origem (link) deve permitir que seu conteúdo seja embarcado (embeded) em páginas externas para que a página possa ser exibida na funcionalidade de análise.

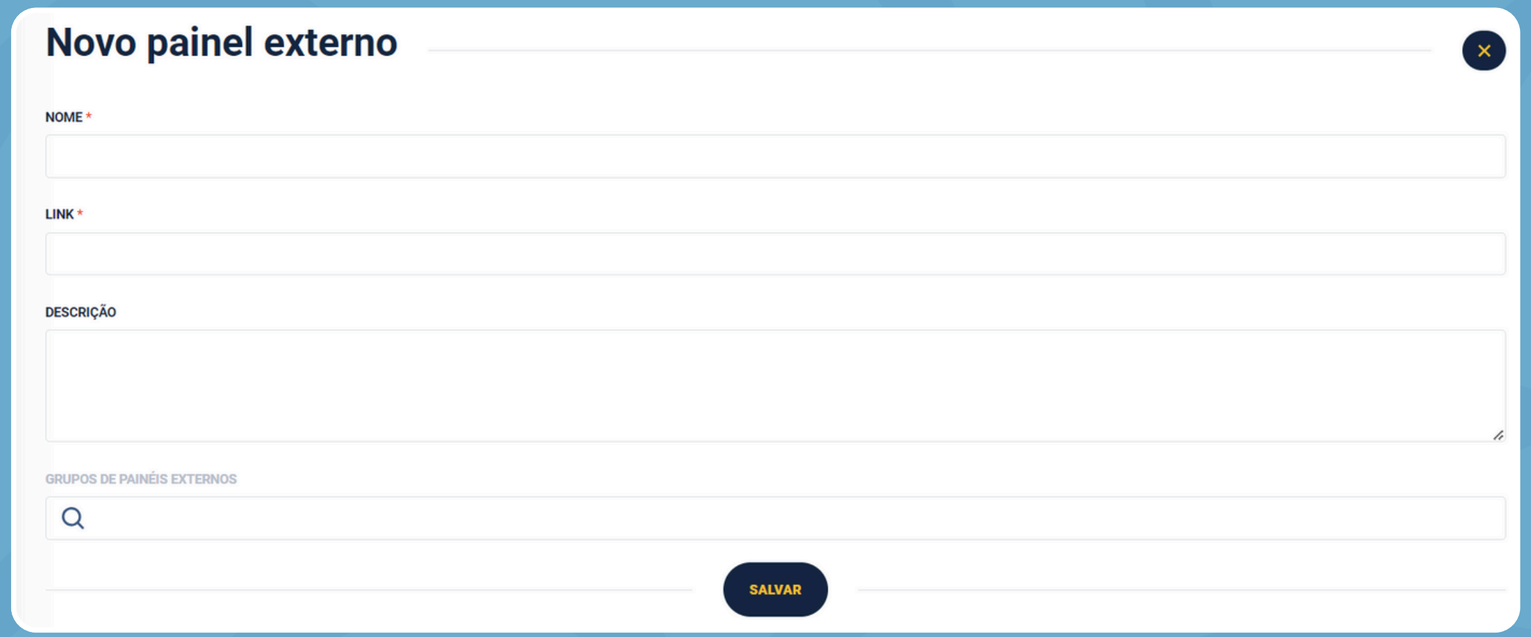


# Configurações

GRUPOS DE PAINÉIS EXTERNOS




Para adicionar um novo grupo de painéis externos clique no botão do canto superior direito.

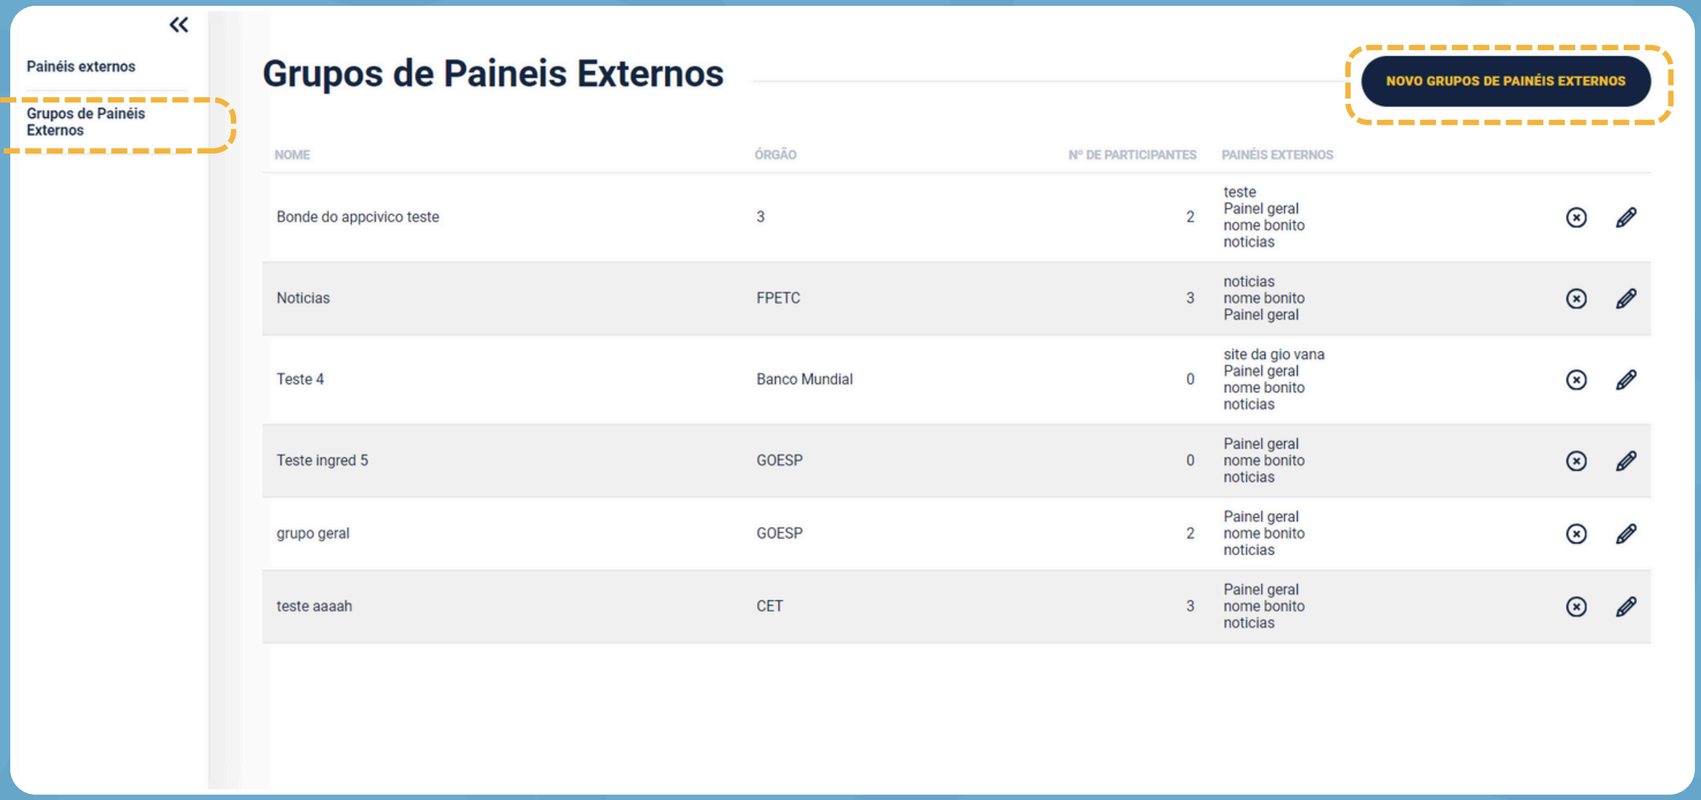

# Configurações


## GRUPOS DE PAINÉIS EXTERNOS

Preencha os campos necessários. Lembre-se que o órgão responsável é o dono deste grupo, e os órgão participantes são os usuários que terão acesso ao painel ao qual o grupo está associado.

Para incluir um órgão participante clique em "**Adicionar órgão participante**".

Novos campos serão abertos para seleção do órgão e das pessoas participantes. Para excluir um órgão clique no "**x**" no lado direito da linha correspondente. Para incluir mais de um órgão clique novamente em "**adicionar órgão**".

Clique em "**Salvar**" para terminar o processo.

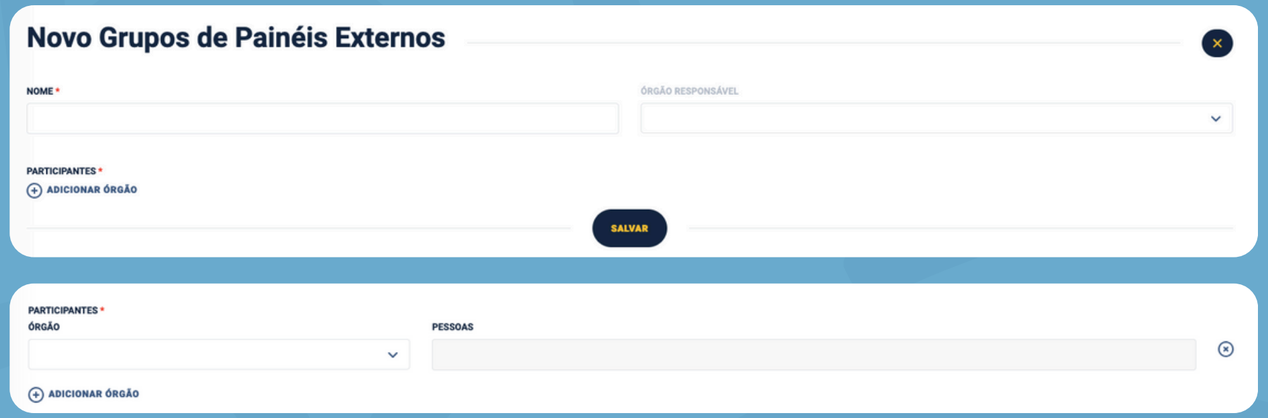

# ADMINISTRAÇÃO

## Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Estratégico

SMAE

SMAE.PREFEITURA.SP.FGV.BR

Esse é o menu de administração, com um sub-menu dentro.

Entramos em mais detalhes sobre gerenciamento de usuários e cadastros básicos nos manuais "Cadastros Básicos" e "Gerenciamento de usuários".

